

= 새로운 시작으로 청풍시대를 열어가는 미래 진안 =  
**공약사업 변경 요청사항**

□ 공약변경 요청 사항

**1. 지덕권 친환경 산림고원 조성사업**

(변경사항) 실천계획 변경

(사 유) 사업추진에 따른 실천계획 현행화

**2. 군립 자연휴양림 및 지방정원 조성**

(변경사항) 공약사업 분리

군립자연휴양림 및 지방정원 조성 → 군립 자연휴양림  
진안고원 지방정원 조성

(사 유) 각 사업별 단위가 크고 성격이 달라 개별공약으로 추진

**3. 금강·섬진강 종합관광 계획 시행**

(변경사항) 공약명칭 및 실천계획 변경

명칭 : 금강·섬진강 종합관광 계획시행 → 금강·섬진강 종합관광 개발 추진

(사 유) 사업명칭 명확화 및 실천계획 현행화

## 변경 전

2-3

### 지덕권 친환경 산림고원 조성사업

|                      |                                     |       |            |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 산림과(산림치유)<br>팀 장 : 안시관<br>담당자 : 유다빈 | 사업구분  | 임기 후       | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2023. ~ 2033.                       | 소요예산  | 262,700백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 룰 | 20%        |     |    |

#### 1 공약 최종목표

○ 예비타당성 대상 사업 통과 및 국가사업 추진 선정

#### 2 사업개요

- ☐ 사업위치 : 진안군 백운면 노촌리 산1-5 신광재 일원(도유림 15ha)
- ☐ 사업기간 : 2023년~2033년(11개년 계획)
- ☐ 사 업 비 : 2,627억원(국비)
- ☐ 사업내용 : 약용작물 원료·체험 기반 구축 ⇒ 연구개발, 상품화
  - (1단계) 정원형 약용작물단지, 체험센터, 기술개발 연구소 조성
  - (2단계) 세계산림치유박람회 개최, 체험프로그램 개발, 상품화
    - \* 바이오산업, 산림농가, 연구기관 참여의 산림생명자원 산업화 플랫폼 구축
- ⇒ **중점** 국립지덕권산림치유원은 힐링, 휴양 / 신광재는 체험관광, 소득창출
- 시행기관 : 산림청, 전라북도, 진안군

#### < 도유림(신광재) 활용 기본계획 수립 연구용역 >

- 용역비/기간 : 금174백만원(도비) / '22. ~ '23.
  - (착수보고) '22.6./ (중간보고) '22.10./ (최종보고) '23.3.
- 용역업체 : 국토연구원

## 변경 요청사항 [변경사항 “파란색” 표기]

2-3

### 지덕권 친환경 산림고원 조성사업

|                      |                                     |       |            |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 산림과(산림치유)<br>팀 장 : 안시관<br>담당자 : 유다빈 | 사업구분  | 임기 후       | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2023. ~ 2033.                       | 소요예산  | 262,700백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 룰 | 20%        |     |    |

#### 1 공약 최종목표

○ 예비타당성 대상 사업 통과 및 국가사업 선정

#### 2 사업개요

- ☐ 사업위치 : 진안군 백운면 노촌리, 장수군 천천면 비룡리 일원(500ha)
- ☐ 사업기간 : 2023년~2033년(11개년)
- ☐ 사 업 비 : 2,627억원(국비)
- ☐ 사업내용 : “세계 산림(약용) 식물 활용 단지 조성”
  - 세계 산림약용식물 테스트베드(실내 대형온실, 야외 테스트베드)
  - 산림교육·체험 융복합(산림유학원, 산림교육체험센터)
  - 고원생태 체험·관광(글로벌 허브 테마파크, 신광재 고원체험공간)
  - 축제·전시·브랜딩(축제 액티비티 공간, 전시, 관람, 홍보 공간)
- ⇒ **중점** 국립지덕권산림치유원은 힐링, 휴양 / 신광재는 체험관광, 소득창출

변경 전

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업  | 구분 | 계       | 22년 | 23년   | 24년   | 25년    | 26년    | 임기 후    |
|---|----|---------|-----|-------|-------|--------|--------|---------|
|   | 계  | 262,700 | 0   | 2,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 232,700 |
| 계   | 국비 | 262,700 | 0   | 2,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 232,700 |
|   | 도비 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
|   | 군비 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
|   | 기타 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
| 1단계<br>- 정원,체험센터<br>- 융합지원센터<br>- 컨벤션센터<br>- 지역특화단지 | 국비 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
|   | 도비 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
|   | 군비 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
|   | 기타 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
| 2단계<br>- 약용정원박람회<br>- 세계정원박람회<br>- 벤처창업경진대회         | 국비 | 262,700 | 0   | 2,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 232,700 |
|   | 도비 | 0       | 0   |       | 0     | 0      | 0      | 0       |
|   | 군비 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |
|   | 기타 | 0       | 0   | 0     | 0     | 0      | 0      | 0       |

4 연도별 추진계획 및 목표

지덕권 친환경 산림고원 조성사업

| 구 분  | 추진계획                                    | 목표(%) |
|------|---|-------|
| 2022 | 하반기 · 기본계획 수립 연구용역                      | 20    |
| 2023 | 상반기 · 기본계획 수립 연구용역, 예비타당성 조사 제출         | 50    |
|      | 하반기 · 예비타당성 조사(기재부), 예비타당성 통과           | 100   |
| 2024 | 상반기 · 사업예산 반영 및 기본설계 용역                 | 100   |
|      | 하반기 · 기본 및 실시설계용역                       | 100   |
| 2025 | 상반기 · (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축          | 100   |
|      | 하반기 · (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축          | 100   |
| 2026 | 상반기 · (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축          | 100   |
|      | 하반기 · (1단계) 정원형 약용작물단지 조성 및 건축          | 100   |
| 임기 후 | · (1단계) 조성 및 건축, (2단계) 박람회 및 벤처창업경진대회 등 | 100   |

변경 후 [변경사항 “파란색” 표기]

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                      | 구분 | 계       | 22년 | 23년 | 24년 | 25년   | 26년    | 임기후     |
|---------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-------|--------|---------|
| 계                         |    | 262,700 | 0   | 0   | 500 | 4,399 | 14,880 | 242,921 |
| 세계산림<br>식물<br>융복합단지<br>조성 | 국비 | 262,700 | 0   | 0   | 500 | 4,399 | 14,880 | 242,921 |
|                           | 도비 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0       |
|                           | 군비 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0       |
|                           | 기타 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0       |

4 연도별 추진계획 및 목표

지덕권 친환경 산림고원 조성사업

| 구 분  | 추진계획   | 목표(%) |
|------|--|-------|
| 2022 | 하반기 · 기본계획 수립 연구용역   | 20    |
| 2023 | 상반기 · 기본계획 수립 연구용역   | 20    |
|      | 하반기 · 국가 정책사업 선정을 위한 부처(기재부, 산림청) 설명                       | 20    |
| 2024 | 상반기 · 산림청 자체 기본구상 및 타당성 조사 용역 실시                           | 30    |
|      | 하반기 · 산림청 기본구상 및 타당성 조사 용역 실시<br>· 예비타당성 대상사업 제출(산림청→기재부)  | 50    |
| 2025 | 상반기 · 기재부 예비타당성 대상사업 선정(재정사업 평가위원회)<br>· 기재부 예비타당성 조사(KDI) | 70    |
|      | 하반기 · 기재부 예비타당성 조사(KDI)                                    | 70    |
| 2026 | 상반기 · 예비타당성 통과, 사업예산 반영 및 기본설계                             | 100   |
|      | 하반기 · 사업예산 반영 및 기본설계                                       | 100   |
| 임기 후 | · 사업 착공, 조성(2028~2033)                                     | 100   |

변경 전

2-8

군립 자연휴양림 및 지방정원 조성

|                      |                                     |       |           |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 산림과(산림정책)<br>팀 장 : 최건호<br>담당자 : 함미진 | 사업구분  | 임기 내      | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. ~ 2026. 6.                    | 소요예산  | 85,000백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 추진 중                                | 이 행 률 | 15%       |     |    |

1 공약 최종목표

- 천혜의 자연환경과 풍부한 산림자원을 활용한 최적 입지조건의 군립 자연휴양림(1개소) 및 정원문화와 산업육성을 위한 명품 지방정원(1개소) 조성·운영

2 사업개요

□ 군립 자연휴양림 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 진안군 부귀면 황금리 산190번지
- 사 업 비 : 450억원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 숙박시설, 편익시설, 위생시설, 체험교육시설 등
- 시행기관 : 진안군

□ 지방정원 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 진안군 진안읍 운산리 인공습지 일원
- 사 업 비 : 400억원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 5종 이상의 주제정원, 방문자센터, 편의시설, 체험시설 등
- 시행기관 : 진안군

변경 요청사항 [변경사항 “파란색” 표기]

2-8

군립 자연휴양림 조성

|                      |                                     |       |           |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 산림과(산림정책)<br>팀 장 : 최건호<br>담당자 : 함미진 | 사업구분  | 임기 내      | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. ~ 2026. 6.                    | 소요예산  | 12,000백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 추진 중                                | 이 행 률 | 20%       |     |    |

1 공약 최종목표

- 천혜의 자연환경과 풍부한 산림자원을 활용한 최적 입지조건의 군립 자연휴양림(1개소) 조성

2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- 사업위치 : 진안군 부귀면 황금리 산190번지
- 사 업 비 : 120억원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 숙박시설, 편익시설, 위생시설, 체험교육시설 등
- 시행기관 : 진안군

변경 전

| 3 연도별 투자계획 (단위: 백만원) |    |        |     |       |        |        |        |     |
|----------------------|----|--------|-----|-------|--------|--------|--------|-----|
| 세부사업                 | 구분 | 계      | '22 | '23   | '24    | '25    | '26.6  | 임기후 |
| 계                    |    | 85,000 | 0   | 1,000 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | 0   |
| 군립<br>자연휴양림<br>조성    | 국비 | 0      | 0   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|                      | 도비 | 22,500 | 0   | 500   | 8,000  | 8,000  | 6,000  | 0   |
|                      | 군비 | 22,500 | 0   | 500   | 8,000  | 8,000  | 6,000  | 0   |
|                      | 기타 | 0      | 0   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0   |
| 지방정원<br>조성           | 국비 | 0      | 0   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0   |
|                      | 도비 | 20,000 | 0   | 0     | 7,000  | 7,000  | 6,000  | 0   |
|                      | 군비 | 20,000 | 0   | 0     | 7,000  | 7,000  | 6,000  | 0   |
|                      | 기타 | 0      | 0   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0   |

4 연도별 추진계획 및 목표

□ 군립 자연휴양림 조성

| 구 분  |     | 추진계획                            | 목표(%) |
|------|-----|---------------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 사전입지조사 용역 및 자연휴양림 지정고시        | 20    |
| 2023 | 상반기 | · 기본계획 및 실시설계 수립, 토지교환(국유림↔군유림) | 40    |
|      | 하반기 | · 자연휴양림 조성계획 승인                 | 50    |
| 2024 | 상반기 | · 사업 착공 및 시행                    | 60    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                         | 70    |
| 2025 | 상반기 | · 사업 시행                         | 80    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                         | 90    |
| 2026 | 상반기 | · 사업 준공                         | 100   |
|      | 하반기 | · 자연휴양림 홍보 및 운영                 |       |
| 임기후  |     |                                 |       |

변경 후 [변경사항 “파란색” 표기]

| 3 연도별 투자계획 (단위: 백만원) |    |        |     |       |       |       |       |     |
|----------------------|----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 세부사업                 | 구분 | 계      | '22 | '23   | '24   | '25   | '26.6 | 임기후 |
| 계                    |    | 12,000 | 0   | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 0   |
| 군립<br>자연휴양림<br>조성    | 국비 | 0      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                      | 도비 | 6,000  | 0   | 500   | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0   |
|                      | 군비 | 6,000  | 0   | 500   | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0   |
|                      | 기타 | 0      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |

4 연도별 추진계획 및 목표

| 구 분  |     | 추진계획                            | 목표(%) |
|------|-----|---------------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 사전입지조사 용역 및 자연휴양림 지정고시        | 20    |
| 2023 | 상반기 | · 기본계획 및 실시설계 수립, 토지교환(국유림↔군유림) | 40    |
|      | 하반기 | · 자연휴양림 조성계획 승인                 | 50    |
| 2024 | 상반기 | · 사업 착공 및 시행                    | 60    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                         | 70    |
| 2025 | 상반기 | · 사업 시행                         | 80    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                         | 90    |
| 2026 | 상반기 | · 사업 준공                         | 100   |
|      | 하반기 | · 자연휴양림 홍보 및 운영                 |       |
| 임기후  |     |                                 |       |

변경 전

지방정원 조성

| 구 분  |     | 추진계획                           | 목표(%) |
|------|-----|--------------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 사업대상지 변경                     | 20    |
| 2023 | 상반기 | · 기본구상용역(타당성평가)                | 30    |
|      | 하반기 | · 토지매입 및 행정절차 이행, 예산확보         | 40    |
| 2024 | 상반기 | · 토지매입 및 행정절차 이행, 기본 및 실시설계 용역 | 50    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                        | 60    |
| 2025 | 상반기 | · 사업 시행                        | 75    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                        | 90    |
| 2026 | 상반기 | · 사업 준공, 홍보 및 운영               | 100   |
|      | 하반기 |                                |       |
| 임기후  |     | · 국가정원 승격                      |       |

5 연도별 추진실적 및 달성률

군립 자연휴양림 조성

| 구 분  |     | 추진실적  | 달성률(%) |
|------|-----|---|--------|
| 2022 | 하반기 | · 사전입지조사 용역 완료<br>· 자연휴양림 지정 신청(군수 제출 ⇒ 도지사 경유 ⇒ 산림청장 제출) | 20     |
| 2023 | 상반기 | · 자연휴양림 지정 신청(산림청 검토 중)                                   | 20     |

지방정원 조성

| 구 분  |     | 추진실적                       | 달성률(%) |
|------|-----|----------------------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 사업대상지 변경                 | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 기본구상 및 타당성 조사 용역 일상감사 의뢰 | 10     |

변경 후 (변경사항 “파란색” 표기)

5 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적  | 달성률(%) |
|------|-----|---|--------|
| 2022 | 하반기 | · 사전입지조사 용역 완료<br>· 자연휴양림 지정 신청(군수 제출 ⇒ 도지사 경유 ⇒ 산림청장 제출) | 20     |
| 2023 | 상반기 | · 자연휴양림 지정 · 고시(산림청)                                      | 20     |

6 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업              | 구분 | 계     | ‘22 | ‘23   | ‘24 | ‘25 | ‘26.6. |
|-------------------|----|-------|-----|-------|-----|-----|--------|
| 계                 |    | 1,090 | 40  | 1,000 | 0   | 0   | 0      |
| 군립<br>자연휴양림<br>조성 | 국비 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0      |
|                   | 도비 | 500   | 0   | 500   | 0   | 0   | 0      |
|                   | 군비 | 540   | 40  | 500   | 0   | 0   | 0      |
|                   | 기타 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0      |

8 향후 추진계획

- 자연휴양림 기본 및 실시설계 수립, 개별법 인·허가 절차 이행 : ‘23. 4. ~ 12.
- 자연휴양림 사업부지 내 국유림과 군유림 교환 절차 이행 : ‘24. 1. ~ 12.
- 자연휴양림 조성계획 승인 및 사업시행 : ‘24. 1. ~ ‘26. 6.

변경 전

6 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업              | 구분 | 계     | ‘22 | ‘23   | ‘24 | ‘25 | ‘26.6. |
|-------------------|----|-------|-----|-------|-----|-----|--------|
| 계                 |    | 1,090 | 40  | 1,050 | 0   | 0   | 0      |
| 군립<br>자연휴양림<br>조성 | 국비 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0      |
|                   | 도비 | 500   | 0   | 500   | 0   | 0   | 0      |
|                   | 군비 | 540   | 40  | 500   | 0   | 0   | 0      |
|                   | 기타 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0      |
| 지방정원 조성           | 국비 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0      |
|                   | 도비 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0      |
|                   | 군비 | 50    | 0   | 50    | 0   | 0   | 0      |
|                   | 기타 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0      |

8 향후 추진계획

- 자연휴양림 기본 및 실시설계 수립, 개별법 인허가 절차 이행 : ‘23. 4. ~ 12.
- 자연휴양림 사업부지 내 국유림과 군유림 교환 절차 이행 : ‘24. 1. ~ 12.
- 자연휴양림 조성계획 승인 및 사업시행 : ‘24. 1. ~ ‘26. 6.
- 지방정원 기본구상용역 추진 : ‘23. 4. ~ 12.
- 지방정원 주민공청회, 전문가 포럼 개최 : ‘23. 4. ~ 9.
- 지방정원 공모전 개최 및 우수사례 수집 : ‘23. 4. ~ 10.
- 지방정원 토지매입 및 행정절차 이행 : ‘24. 1. ~ 12.
- 지방정원 기본 및 실시설계 용역 및 사업시행 : ‘24. 1. ~ ‘26. 6.

변경 요청사항 [변경사항 “파란색” 표기]

2-12 지방정원 조성

|                      |                                     |       |           |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 산림과(산림정책)<br>팀 장 : 최건호<br>담당자 : 함미진 | 사업구분  | 임기 내      | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. ~ 2026. 6.                    | 소요예산  | 40,000백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 추진 중                                | 이 행 률 | 15%       |     |    |

1 공약 최종목표

- 정원문화와 산업육성을 위한 명품 지방정원(1개소) 조성·운영

2 사업개요

- 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- 위 치 : 진안군 진안읍 운산리 인공습지 일원
- 사 업 비 : 400억원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 5종 이상의 주제정원, 방문자센터, 편의시설, 체험시설 등
- 시행기관 : 진안군

| 변경 전 |  |
|------|--|
|      |  |

| 변경 후 [변경사항 “파란색” 표기] |     |                                |     |     |        |        |        |       |
|----------------------|-----|--------------------------------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|
| 3 연도별 투자계획           |     | (단위: 백만원)                      |     |     |        |        |        |       |
| 세부사업                 | 구분  | 계                              | '22 | '23 | '24    | '25    | '26.6  | 임기후   |
| 계                    |     | 40,000                         | 0   | 0   | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 0     |
| 지방정원<br>조성           | 국비  | 0                              | 0   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0     |
|                      | 도비  | 20,000                         | 0   | 0   | 7,000  | 7,000  | 6,000  | 0     |
|                      | 군비  | 20,000                         | 0   | 0   | 7,000  | 7,000  | 6,000  | 0     |
|                      | 기타  | 0                              | 0   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0     |
|                      |     |                                |     |     |        |        |        |       |
| 4 연도별 추진계획 및 목표      |     |                                |     |     |        |        |        |       |
| 구 분                  |     | 추진계획                           |     |     |        |        |        | 목표(%) |
| 2022                 | 하반기 | · 사업대상지 변경                     |     |     |        |        |        | 10    |
| 2023                 | 상반기 | · 기본구상용역(타당성평가)                |     |     |        |        |        | 20    |
|                      | 하반기 | · 기본구상용역(타당성평가)                |     |     |        |        |        | 30    |
| 2024                 | 상반기 | · 토지매입 및 행정절차 이행, 기본 및 실시설계 용역 |     |     |        |        |        | 40    |
|                      | 하반기 | · 사업 시행                        |     |     |        |        |        | 50    |
| 2025                 | 상반기 | · 사업 시행                        |     |     |        |        |        | 70    |
|                      | 하반기 | · 사업 시행                        |     |     |        |        |        | 90    |
| 2026                 | 상반기 | · 사업 준공, 홍보 및 운영               |     |     |        |        |        | 100   |
|                      | 하반기 |                                |     |     |        |        |        |       |
| 임기후                  |     | · 국가정원 승격                      |     |     |        |        |        |       |



변경 전

변경 후 (변경사항 “파란색” 표기)

5 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적                  | 달성률(%) |
|------|-----|-----------------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 사업대상지 변경            | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수 | 15     |

6 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업    | 구분 | 계  | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | ‘26.6. |
|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 계       |    | 50 | 0   | 50  | 0   | 0   | 0      |
| 지방정원 조성 | 국비 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |
|         | 도비 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |
|         | 군비 | 50 | 0   | 50  | 0   | 0   | 0      |
|         | 기타 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0      |

8 향후 추진계획

- 지방정원 기본구상용역 추진 : ‘23. 5. ~ 12.
- 지방정원 전문가 포럼 및 주민설명회 : ‘23. 5. ~ 9.
- 지방정원 토지매입 및 행정절차 이행 : ‘24. 1. ~ 12.
- 지방정원 기본 및 실시설계 용역 및 사업시행 : ‘24. 1. ~ ‘26. 6.

## 변경 전

2-4

### 금강·섬진강 종합관광 계획 시행

|                      |                                     |       |          |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 관광과(관광개발)<br>팀 장 : 장서옥<br>담당자 : 권아영 | 사업구분  | 임기 내     | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 7. ~ 2026. 6.                 | 소요예산  | 6,550백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 41%      |     |    |

#### 1 공약 최종목표

○ 금강~마이산~섬진강을 연계하는 진안 힐링휴양 관광벨트 구축

#### 2 사업개요

##### ☐ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 용담호 권역
- 내 용 : 금강(용담호)권역 드라이브 코스 개발 (용담호 주변 휴게소 정비 포함)
  - 테마별 드라이브 코스 개발 (예> 바이크 힐링로드, 차박 힐링로드, 생태 힐링로드)
  - 테마별 휴게소 리모델링
    - 용평 쉼터 : 진안고원길 여행자 센터
    - 월포휴게소 : 바이크 라이더들의 휴식공간
    - 삼락 쉼터 : 무인카페, 관광안내, 포토존 등
    - 옥거 쉼터 : 문화예술공간, 산책로, 관광안내
    - 와룡 쉼터 : 차박지 조성

##### ☐ 섬진강권역 콘텐츠 개발 및 관광자원화 사업 추진

- 사업기간 : 2023. ~ 2023.
- 장 소 : 섬진강 권역
- 사 업 비 : 1,250백만원(군비 1,250)
- 내 용 : 섬진강 권역 분포되어있는 관광자원의 활용을 위한 콘텐츠 개발
  - 섬진강 권역 관광자원을 활용한 치유 관광자원화
  - 섬진강 문류(文流)길 조성

## 변경 후 (변경사항 “파란색” 표기)

2-4

### 금강·섬진강 종합관광 **개발 추진**

|                      |                                     |       |          |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 관광과(관광개발)<br>팀 장 : 장서옥<br>담당자 : 권아영 | 사업구분  | 임기 내     | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 7. ~ 2026. 6.                 | 소요예산  | 6,550백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 41%      |     |    |

#### 1 공약 최종목표

○ 금강~마이산~섬진강을 연계하는 진안 힐링휴양 관광벨트 구축

#### 2 사업개요

##### ☐ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 용담호 권역
- 내 용 : 금강(용담호)권역 드라이브 코스 개발 (용담호 주변 휴게소 정비 포함)
  - 테마별 드라이브 코스 개발 (예> 바이크 힐링로드, 차박 힐링로드, 생태 힐링로드)
  - 테마별 휴게소 리모델링
    - 용평 쉼터 : 진안고원길 여행자 센터
    - 월포휴게소 : 바이크 라이더들의 휴식공간
    - 삼락 쉼터 : 무인카페, 관광안내, 포토존 등
    - 옥거 쉼터 : 문화예술공간, 산책로, 관광안내
    - 와룡 쉼터 : 차박지 조성

##### ☐ 섬진강권역 콘텐츠 개발 및 관광자원화 사업 추진

- 사업기간 : 2023. ~ 2023.
- 장 소 : 섬진강 권역
- 사 업 비 : 1,250백만원(군비 1,250)
- 내 용 : 섬진강 권역 분포되어있는 관광자원의 활용을 위한 콘텐츠 개발
  - 섬진강 권역 관광자원을 활용한 치유 관광자원화
  - 섬진강 문류(文流)길 조성

## 변경 전

### 4 연도별 추진계획 및 목표

#### ☐ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

| 구 분  |     | 추진계획   | 목표(%) |
|------|-----|--|-------|
| 2022 | 하반기 | · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 착공                           | 10    |
| 2023 | 상반기 | · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 완료<br>· 옥거 쉼터, 와룡 쉼터 리모델링 착공 | 20    |
|      | 하반기 | · 옥거 쉼터, 와룡 쉼터 리모델링 완료   | 60    |
| 2024 | 상반기 | · 용평 쉼터, 월포 휴게소 리모델링 착공  | 70    |
|      | 하반기 | · 용평 쉼터, 월포 휴게소 리모델링 완료  | 80    |
| 2025 | 상반기 | · 노성 휴게소 리모델링 착공   | 90    |
|      | 하반기 | · 노성 휴게소 리모델링 완료   | 100   |

#### ☐ 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 추진

| 구 분  |     | 추진계획                           | 목표(%) |
|------|-----|--------------------------------|-------|
| 2023 | 상반기 | · 콘텐츠 개발용역 착수                  | 10    |
|      | 하반기 | · 콘텐츠 개발용역 완료                  | 30    |
| 2024 | 상반기 | · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 추진    | 40    |
|      | 하반기 | · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 완료    | 50    |
| 2025 | 상반기 | · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 설계 추진 | 60    |
|      | 하반기 | · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 완료    | 70    |
| 2026 | 상반기 | · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 착수  | 80    |
|      | 하반기 | · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 완료  | 90    |
| 임기후  |     | · 행정절차 이행 및 섬진강 문류(文流)길 조성 추진  | 100   |

#### ☐ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

| 구 분  |     | 추진계획                    | 목표(%) |
|------|-----|-------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 실시설계용역 완료, 사업 착수(1차분) | 30    |
| 2023 | 상반기 | · 사업 착수(2차분)            | 60    |
|      | 하반기 | · 사업 완료(1차분, 2차분)       | 100   |

#### ☐ 중혈냉천 정비사업

| 구 분  |     | 추진계획                 | 목표(%) |
|------|-----|----------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 정비사업 완료(` 22. 11.) | 100   |

## 변경 후

### 4 연도별 추진계획 및 목표

#### ☐ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

| 구 분  |     | 추진계획  | 목표(%) |
|------|-----|---|-------|
| 2022 | 하반기 | · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 착공                                  | 10    |
| 2023 | 상반기 | · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 완료<br>· 옥거 쉼터, <b>용평 쉼터</b> 리모델링 착공 | 20    |
|      | 하반기 | · 옥거 쉼터, <b>용평 쉼터</b> 리모델링 완료   | 60    |
| 2024 | 상반기 | · <b>와룡 쉼터</b> , 월포 휴게소 리모델링 착공                                       | 70    |
|      | 하반기 | · <b>와룡 쉼터</b> , 월포 휴게소 리모델링 완료                                       | 80    |
| 2025 | 상반기 | · 노성 휴게소 리모델링 착공  | 90    |
|      | 하반기 | · 노성 휴게소 리모델링 완료  | 100   |

#### ☐ 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 추진

| 구 분  |     | 추진계획                           | 목표(%) |
|------|-----|--------------------------------|-------|
| 2023 | 상반기 | · 콘텐츠 개발용역 착수                  | 10    |
|      | 하반기 | · 콘텐츠 개발용역 완료                  | 30    |
| 2024 | 상반기 | · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 추진    | 40    |
|      | 하반기 | · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 완료    | 50    |
| 2025 | 상반기 | · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 설계 추진 | 60    |
|      | 하반기 | · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 완료    | 70    |
| 2026 | 상반기 | · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 착수  | 80    |
|      | 하반기 | · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 완료  | 90    |
| 임기후  |     | · 행정절차 이행 및 섬진강 문류(文流)길 조성 추진  | 100   |

#### ☐ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

| 구 분  |     | 추진계획                    | 목표(%) |
|------|-----|-------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 실시설계용역 완료, 사업 착수(1차분) | 30    |
| 2023 | 상반기 | · 사업 착수(2차분)            | 60    |
|      | 하반기 | · 사업 완료(1차분, 2차분)       | 100   |

#### ☐ 중혈냉천 정비사업

| 구 분  |     | 추진계획                 | 목표(%) |
|------|-----|----------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 정비사업 완료(` 22. 11.) | 100   |

---

= 새로운 시작으로 성공시대를 열어가는 미래 진안 =

# 공약이행평가 군민배심원단(문화관광분과)

---



# 목 차



|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| I. 민선8기 공약사업 현황 .....                 | 1  |
| II. 민선8기 공약사업 자체평가 .....              | 3  |
| III. 민선8기 공약사업 추진상황 .....             | 9  |
| [산림과]                                 |    |
| 2-3 지덕권 친환경 산림고원 조성사업 .....           | 10 |
| 2-8 군립 자연휴양림 조성 .....                 | 14 |
| 2-12 진안고원 지방정원 조성 .....               | 17 |
| [관광과]                                 |    |
| 2-4 금강.섬진강 종합관광 개발 추진 .....           | 20 |
| 2-5 마이산과 용담호를 연결하는 마이동천 탐방로 조성 ...    | 27 |
| 2-6 마이산 남.북부 연결체계 구축 .....            | 31 |
| 2-9 체류형 관광을 위한 다양한 체험 및 숙박시설 조성 ..... | 34 |
| 2-7 진안형 메타버스 구축 .....                 | 41 |
| [농촌지원과]                               |    |
| 2-10 고원음식 연구 및 학술대회 추진 .....          | 44 |
| [기획홍보실]                               |    |
| 2-11 진안고원 브랜드 홍보를 위한 행사추진 .....       | 47 |
| [문화체육과]                               |    |
| 2-1 진안문화예술거리 조성 .....                 | 51 |
| 2-2 진안문화예술회관 건립 .....                 | 54 |

---

## I . 민선 8기 공약사업 추진상황

---

# 1. 공약사업 추진상황

□ 총      괄 : 5개분야, 59개 사업

(2023. 3. 31. 현재)

| 구 분    | 계   | 추진현황 |      |      |     | 비고 |
|--------|-----|------|------|------|-----|----|
|        |     | 완료   | 정상추진 | 일부추진 | 미진  |    |
| 공약수(개) | 59  | 7    | 45   | 4    | 3   |    |
| 구성비(%) | 100 | 11.9 | 74.5 | 6.8  | 6.8 |    |

□ 분야별 추진현황

| 분 야  | 총건수 | 추진현황 |      |      |    | 비고 |
|------|-----|------|------|------|----|----|
|      |     | 완료   | 정상추진 | 일부추진 | 미진 |    |
| 계    | 59  | 7    | 45   | 4    | 3  |    |
| 경제육성 | 15  |      | 14   |      | 1  |    |
| 문화관광 | 11  |      | 10   | 1    |    |    |
| 복지생활 | 18  | 5    | 12   |      | 1  |    |
| 인재양성 | 9   | 1    | 5    | 2    | 1  |    |
| 소통행정 | 6   | 1    | 4    | 1    |    |    |

□ 문화관광분야 추진현황

(단위:백만원)

| 관리번호        | 공약사업명                       | 총사업비    | 완료 | 정상 | 일부추진 | 미진 |
|-------------|-----------------------------|---------|----|----|------|----|
| 문화관광(11개사업) |                             | 401,280 |    | 10 | 1    |    |
| 2-1         | 진안 문화예술거리 조성                | 1,700   |    | ○  |      |    |
| 2-2         | 진안예술회관 건립                   | 32,000  |    |    | ○    |    |
| 2-3         | 지덕권 친환경 산림고원 조성             | 262,700 |    | ○  |      |    |
| 2-4         | 금강·섬진강 종합관광 개발 추진           | 6,550   |    | ○  |      |    |
| 2-5         | 마이산과 용담호를 연결하는‘마이동천 탐방로’조성  | 8,600   |    | ○  |      |    |
| 2-6         | 마이산 남·북부 연결 체계 구축           | 5,450   |    | ○  |      |    |
| 2-7         | 진안형 메타버스 구축                 | 80      |    | ○  |      |    |
| 2-8         | 군립 자연휴양림 및 지방정원 조성          | 52,000  |    | ○  |      |    |
| 2-9         | 체류형 관광을 위한 다양한 체험 및 숙박시설 조성 | 31,300  |    | ○  |      |    |
| 2-10        | 고원음식 연구 및 학술대회 추진           | 200     |    | ○  |      |    |
| 2-11        | 진안고원 브랜드 홍보를 위한 행사 추진       | 700     |    | ○  |      |    |

---

## Ⅱ. 민선 8기 공약사업 자체평가

---



# 1. 공약사업 평가

## □ 평가기준

| 구 분             | 정량적 기준   |   | 정성적 기준  |
|-----------------|--|---|---|
| 완 료             | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업완료, 목표달성, 제도도입 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우</li> </ul>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>주민 만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우</li> </ul>   |
|                 | 이행 후 계속추진  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업</li> <li>▶ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업</li> </ul> |   |
| 정 상 추 진         | <ul style="list-style-type: none"> <li>추진일정, 규모, 단계 등 계획한대로 정상추진 중이고 임기종료 시점까지 이행 완료가 예상되는 사업</li> <li>추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진되는 경우</li> </ul>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>법령 등 제한, 시민단체·주민반대 등 사업추진 제약 사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우</li> <li>※ 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동되는 경우는 정상추진으로 평가</li> </ul> |
| 일 부 추 진 ( 미 진 ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>추진하고 있으나, 예상 목표를 달성하지 못하고 부진한 사업</li> <li>추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 정상적으로 추진되지 않는 경우</li> </ul>   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 사업추진이 부진한 경우</li> </ul>  |
| 보 류             | <ul style="list-style-type: none"> <li>사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 일정기간 사업을 보류하는 경우</li> <li>기타 객관, 타당한 사유가 있어 일정기간 사업을 보류하는 경우</li> <li>도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 사업 시기가 도래하지 않은 경우</li> </ul> |   |   |
| 폐 기             | <ul style="list-style-type: none"> <li>사실상 사업을 취소하기로 한 경우</li> <li>주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우</li> </ul>  |   |   |

## □ 평가방법

- 2023년 평가결과 완료된 사업은 평가에서 제외
- 주관부서별(공약 추진 부서) 자체평가 결과에 대하여 공약 실천계획 대비 당해연도 추진실적을 비교 평가(이행율, 평가기준 등)

## □ 공약 평가 목록

| 관리<br>번호 | 공 약 명                       | 이행율  | 이행현황 |
|----------|-----------------------------|------|------|
|          | 11개 사업                      | 23.6 |      |
| 2-1      | 진안 문화예술거리 조성                | 25%  | 정상추진 |
| 2-2      | 진안예술회관 건립                   | 15%  | 일부추진 |
| 2-3      | 지덕권 친환경 산림고원 조성             | 20%  | 정상추진 |
| 2-4      | 금강·섬진강 종합관광 개발 추진           | 41%  | 정상추진 |
| 2-5      | 마이산과 용담호를 연결하는‘마이동천 탐방로’조성  | 10%  | 정상추진 |
| 2-6      | 마이산 남·북부 연결 체계 구축           | 9%   | 정상추진 |
| 2-7      | 진안형 메타버스 구축                 | 30%  | 정상추진 |
| 2-8      | 군립 자연휴양림 및 지방정원 조성          | 15%  | 정상추진 |
| 2-9      | 체류형 관광을 위한 다양한 체험 및 숙박시설 조성 | 15%  | 정상추진 |
| 2-10     | 고원음식 연구 및 학술대회 추진           | 30%  | 정상추진 |
| 2-11     | 진안고원 브랜드 홍보를 위한 행사 추진       | 50%  | 정상추진 |

## □ 공약 자체평가 결과

| 관리<br>번호          | 사 업 명       | 규모(백만원)                    |          |          | 추진 실적   | 공약<br>이행도<br>[%] |
|-------------------|-------------|----------------------------|----------|----------|---|------------------|
|                   |             | 사업내용                       | 총<br>사업비 | 확보<br>예산 |   |                  |
| 2. 가고싶고 찾고싶은 휴양관광 |             |                            | 401,280  | 14,591   |   | 23.6             |
| 2-1               | 진안문화예술거리 조성 | ·차 없는 거리에서 문화예술 공연 및 전시 개최 | 1,700    | 69       | (2022년 하반기)<br>·2023년 본예산 반영 : 50,000천원<br>·진안문화예술거리 운영계획 수립 : 2022. 12.<br><br>(2023년 1분기)<br>·문화예술거리 운영 대행용역 발주 : 2023. 4.<br>·문화예술거리 조성 연구용역 발주 : 2023. 4. | 25               |
| 2-2               | 진안문화예술회관 건립 | ·전문적인 시설 및 장비를 갖춘 공연장 건립   | 32,000   | 22       | (2022년 하반기)<br>·진안군 중기지방재정계획 반영 : 2022.11.<br><br>(2023년 1분기)   | 15               |

| 관리<br>번호 | 사 업 명                        | 규모(백만원)  |          |          | 추진 실적  | 공약<br>이행도<br>[%] |
|----------|------------------------------|--|----------|----------|--|------------------|
|          |                              | 사업내용   | 총<br>사업비 | 확보<br>예산 |  |                  |
|          |                              |  |          |          | ·진안문화예술회관 건립 타당성 연구용역 실시 : 2023. 1. 31.~ 5. 7.<br>(19,800천원 / (사)전북경제연구원)  |                  |
| 2-3      | 지덕권 친환경 산림고원 조성              | ·국내외 산림(약용) 식물 원료·체험 단지 조성<br>(국가사업 추진)  | 262,700  | -        | (2022년 하반기)<br>·기본계획 수립('22.4.21~'23.4.20.)<br>-국토연구원, 174백만원(도비)<br>·산림청장, 안호영의원 현장방문 ('22.12.)<br><br>(2023년 1분기)<br>·기본계획 중간보고회('23.2.3.)<br>-세계 산림(약용)식물단지 조성<br>·기재부, 산림청 국가예산 건의(수시)<br>·기본계획 최종보고회('23.4.20.)   | 20               |
| 2-4      | 금강·섬진강 종합 관광계획 개발추진          | ·금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발<br>·섬진강권역 관광 콘텐츠 개발 및 관광자원화 추진<br>·부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업<br>·풍혈냉천 정비사업 | 6,550    | 3,200    | (2022년 하반기)<br>·용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업<br>-1개소(삼락침터) 착공<br>·부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업<br>-실시설계용역 완료<br>-원가심사 등 행정절차 이행<br>-사업 착공<br>·풍혈냉천 정비사업<br>-사업완료('22. 11.)<br><br>(2023년 1분기)<br>·용담호(금강) 권역 드라이브 코스 개발<br>-용평침터 시설개선사업 실시설계용역 착수('23. 2.)<br>-옥거침터 리모델링 실시설계용역 착수('23. 3.)<br>·섬진강권역 콘텐츠 개발용역<br>-콘텐츠 개발용역 착수('23. 3.) | 41               |
| 2-5      | 마이산과 용담호를 연결하는 “마이동천 탐방로” 조성 | ·관광경쟁력 강화를 위한 탐방로 조성   | 8,600    | 400      | (2022년 하반기)<br>·마이산 북부~연건습지 탐방로 정비계획 수립<br>·국가 생태탐방로 공모사업 선정<br><br>(2023년 1분기)<br>·마이산 북부~연건습지 탐방로 정비<br>-실시설계용역 착수   | 10               |
| 2-6      | 마이산 남·북부 연결 체계 구축            | ·마이산 남·북부 연결 체계 구축   | 5,450    | 50       | (2022년 하반기)<br>·마이산 남·북부 구상안 도출<br>·관광객, 공무원, 군민 등 설문조사 완료<br><br>(2023년 1분기)<br>·용역 중간보고<br>·노선 및 이동수단(안) 구상<br>·문화재청 방문 의견청취   | 9                |

| 관리<br>번호 | 사 업 명                              | 규모(백만원)   |          |          | 추진실적  | 공약<br>이행도<br>[%] |
|----------|------------------------------------|---|----------|----------|---|------------------|
|          |                                    | 사업내용  | 총<br>사업비 | 확보<br>예산 |   |                  |
| 2-7      | 진안형 메타버스<br>구축                     | ·메타버스(제페토)<br>플랫폼 내 진안 월<br>드맵 구축   | 80       | 50       | (2022년 하반기)<br>·월드맵 구축 관광지 구상<br><br>(2023년 1분기)<br>·월드맵 구축 업체 용역계약 : '23.3.<br>-마이산도립공원 디자인 실시   | 30               |
| 2-8      | 군립 자연휴양림<br>조성                     | (자연휴양림)<br>·숙박시설, 편의시설<br>등   | 12,000   | 1,040    | (2022년 하반기)<br>·(자연휴양림) 사전입지조사용역 완료<br>및 자연휴양림 지정 신청<br><br>(2023년 1분기)<br>·(자연휴양림) 자연휴양림 지정·고시(산림청)  | 20               |
| 2-9      | 체류형 관광을 위<br>한 다양한 체험<br>및 숙박시설 조성 | ·마이산 4색 에너지<br>충전소 조성<br>-4가지 테마(감성,<br>열정, 활력, 관계)<br>체험 콘텐츠존 조성<br>·지오프랜드 탐사일<br>주여행 프로젝트<br>추진<br>-지오후하우스 조성<br>(게스트하우스, 캠<br>핑장 등)<br>·진안고원 마이스테<br>이 조성<br>-숙박 및 관광편의<br>시설 조성, 치유헤<br>링 프로그램 개발<br>·운일암반일암 테마<br>공원 조성사업<br>-주자천 활용 테<br>마공원 조성 | 31,300   | 9,145    | (2022년 하반기)<br>·마이산 4색 에너지 충전소 조성<br>-기본계획 수립용역 완료<br>-1단계(감성, 열정) 실시설계용역 착수<br>·진안고원 마이스테이 조성<br>-기본계획 수립용역 착수<br>·지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트<br>-기본계획 수립용역 완료<br>-지역개발구역지정 및 실시설계용역<br>착수<br>·운일암반일암 테마공원 조성사업<br>-테마공원 실시설계용역 착수<br>·지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트<br>-지역개발구역지정 및 실시설계용역<br>추진<br><br>(2023년 1분기)<br>·마이산 4색 에너지 충전소 조성<br>-1단계(감성, 열정) 실시설계용역 추진<br>·진안고원 마이스테이 조성<br>-토지매입 완료<br>·운일암반일암 테마공원 조성사업<br>-테마공원 실시설계용역 추진 | 15               |
| 2-10     | 고원음식 연구 및<br>학술대회 추진               | ·진안고원 연구모임<br>조직<br>·고원음식 토론회및<br>학술대회 추진   | 200      | 50       | (2022년 하반기)<br>·2023년 고원음식 연구 및 학술대회<br>추진계획 수립<br>·고원음식 학술대회 예산반영<br><br>(2023년 1분기)<br>·진안고원 연구모임 조직 및 간담회 추진   | 30               |
| 2-11     | 진안고원 브랜드<br>홍보를 위한<br>행사 추진        | ·진안고원 이미지화<br>·진안고원 브랜드 홍보<br>알리기 선포 행사   | 700      | 515      | (2022년 하반기)<br>·기본계획 수립(자체)<br>·진안고원 정립 및 이미지화<br><br>(2023년 1분기)<br>·진안고원 브랜드 홍보를 위한 각종 이미지화<br>-본청 내부 멀티비전 설치로 진안고원<br>이미지 및 영상 홍보  | 50               |

| 관리<br>번호 | 사 업 명           | 규모(백만원)                     |          |          | 추진 실적   | 공약<br>이행도<br>[%] |
|----------|-----------------|-----------------------------|----------|----------|---|------------------|
|          |                 | 사업내용                        | 총<br>사업비 | 확보<br>예산 |   |                  |
|          |                 |                             |          |          | -KTX 오송역 내 광고판 홍보<br>-전국노래자랑 진안군편 대형 현수막 홍보<br>-진안고원 홍보 영상 유튜브 광고   |                  |
| 2-12     | 진안고원<br>지방정원 조성 | (지방정원)<br>·5종 이상의 주제정원<br>등 | 40,000   | 50       | (2022년 하반기)<br>·(지방정원) 사업대상지 변경 및 '23 기본<br>구상용역비 편성<br><br>(2023년 1분기)<br>·(지방정원) 기본구상 및 타당성 조사 용역<br>착수 | 15               |

## 2. 공약사업 공약조정 및 심의

### □ 공약조정 및 심의

- 공약추진 과정에서 정책여건 변화, 행정절차 이행(사회보장제도 신설 등) 과정에서 공약의 변경이 필요한 경우 공약 조정 및 심의
- 공약의 변경·조정 사유의 타당성, 적절성 등 심의

### □ 공약조정 및 심의 목록

| 관리<br>번호 | 공 약 명               | 내 용               |
|----------|---------------------|-------------------|
| 2-3      | 지덕권 친환경산림고원 조성      | 실천계획 변경           |
| 2-4      | 금강.섬진강 종합관광계획 수립 시행 | 공약명칭 변경 및 실천계획 변경 |
| 2-8      | 군립 자연휴양림 및 지방정원 조성  | 공약 분리             |

※ 별도자료 참고

---

### Ⅲ. 민선 8기 공약사업 추진상황

---

## 지덕권 친환경 산림고원 조성사업

|                      |                                     |       |            |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 산림과(산림치유)<br>팀 장 : 안시관<br>담당자 : 유다빈 | 사업구분  | 임기 후       | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2023. ~ 2033.                       | 소요예산  | 262,700백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 20%        |     |    |

### 1 공약 최종목표

○ 예비타당성 대상 사업 통과 및 국가사업 추진 선정

### 2 사업개요

- ☐ 사업위치 : 진안군 백운면 노촌리, 장수군 천천면 비룡리 일원(500ha)
- ☐ 사업기간 : 2023년~2033년(11개년)
- ☐ 사 업 비 : 2,627억원(국비)
- ☐ 사업내용 : “세계 산림(약용) 식물 활용 단지 조성”
  - 세계 산림약용식물 테스트베드(실내 대형온실, 야외 테스트베드)
  - 산림교육·체험 융복합(산림유학원, 산림교육체험센터)
  - 고원생태 체험·관광(글로벌 허브 테마파크, 신광재 고원체험공간)
  - 축제·전시·브랜딩(축제 액티비티 공간, 전시, 관람, 홍보 공간)

⇒ **중점** 국립지덕권산림치유원은 힐링, 휴양 / 신광재는 체험관광, 소득창출

## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                       | 구분 | 계       | 22년 | 23년 | 24년 | 25년   | 26년    | 임기후     |
|----------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-------|--------|---------|
| 계                          |    | 262,700 | 0   | 0   | 500 | 4,399 | 14,880 | 242,921 |
| 세계 산림<br>식물<br>융복합단지<br>조성 | 국비 | 262,700 | 0   | 0   | 500 | 4,399 | 14,880 | 242,921 |
|                            | 도비 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0       |
|                            | 군비 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0       |
|                            | 기타 | 0       | 0   | 0   | 0   | 0     | 0      | 0       |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

## □ 지덕권 친환경 산림고원 조성사업

| 구 분  |     | 추진계획   | 목표(%) |
|------|-----|--|-------|
| 2022 | 하반기 | · 기본계획 수립 연구용역   | 20    |
| 2023 | 상반기 | · 기본계획 수립 연구용역   | 20    |
|      | 하반기 | · 국가 정책사업 선정을 위한 부처(기재부, 산림청) 설명                       | 20    |
| 2024 | 상반기 | · 산림청 자체 기본구상 및 타당성 조사 용역 실시                           | 30    |
|      | 하반기 | · 산림청 기본구상 및 타당성 조사 용역 실시<br>· 예비타당성 대상사업 제출(산림청→기재부)  | 50    |
| 2025 | 상반기 | · 기재부 예비타당성 대상사업 선정(재정사업 평가위원회)<br>· 기재부 예비타당성 조사(KDI) | 70    |
|      | 하반기 | · 기재부 예비타당성 조사(KDI)                                    | 70    |
| 2026 | 상반기 | · 예비타당성 통과, 사업예산 반영 및 기본설계                             | 100   |
|      | 하반기 | · 사업예산 반영 및 기본설계                                       | 100   |
| 임기 후 |     | · 사업 착공, 조성(2028~2033)                                 | 100   |



## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적   | 달성률(%) |
|------|-----|--|--------|
| 2022 | 하반기 | · 기본계획 수립용역(`22.4.~`23.4., 전라북도 시행, 국토연구원)<br>- 중간보고회(`22.10.)<br>· 안호영 국회의원, 산림청장 현장 방문 (`22.12.2.)   | 20     |
| 2023 | 상반기 | · 기본계획 수립 중간보고(`23.2.3.)<br>· 도지사 연초방문 주요현안 논의(`23.2.7.)<br>· 기재부, 산림청 국가예산 확보 건의(도, 군)<br>· 국회의원 지역현안 협의(`23.3.24, 안호영의원-부군수)<br>· 관계기관 실무협의(`23.4.6. 산림청, 도, 군, 국토연구원)<br>· 기본계획 수립 최종보고(`23.4.20.)) | 20     |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업                      | 구분 | 계 | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
|---------------------------|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 계                         |    | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| - 세계 산림(약용)식물<br>융복합단지 조성 | 국비 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                           | 도비 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                           | 군비 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|                           | 기타 | 0 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

## 7

## 향후 추진계획

- 기본계획 수립 연구용역 추진(도) : '22. 4. 21. ~ '23. 4. 20.(1년)


**< 도유림(신광재) 활용 기본계획 수립 연구용역 >**

- 용역비/기간/수행기관 : 금174백만원(도비) / '22. ~ '23. /국토연구원  
- (착수보고) '22.6./ (중간보고) '22.10./ (최종보고) '23.4.20.

- 중기사업계획 제출(산림청→기재부) : '23. 1.  
○ 산림청 자체 검증 후 기재부 예타 신청 계획  
- 2024년 '타당성 조사 및 기본구상' 용역 국비 5억원 반영 예정



산림청장, 안호영의원 현장방문(22.12.2)

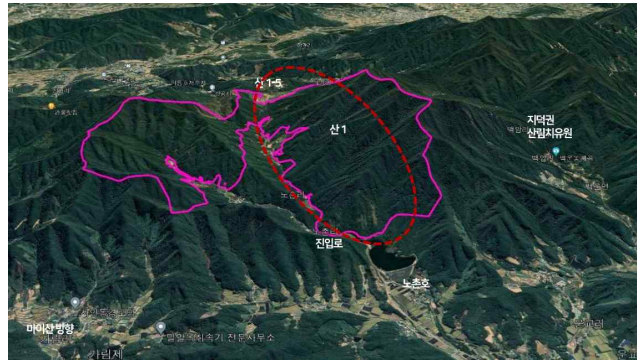

도유림 현황 및 입지



기본구상 연계도



컨셉(Global Herbtopia)

## 군립 자연휴양림 조성

|                      |                                     |       |           |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 산림과(산림정책)<br>팀 장 : 최건호<br>담당자 : 함미진 | 사업구분  | 임기 내      | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. ~ 2026. 6.                    | 소요예산  | 12,000백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 20%       |     |    |

### 1 공약 최종목표

- 천혜의 자연환경과 풍부한 산림자원을 활용한 최적 입지조건인 군립 자연휴양림(1개소) 조성

### 2 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- ☐ 사업위치 : 진안군 부귀면 황금리 산190번지
- ☐ 사 업 비 : 120억원(도비 50%, 군비 50%)
- ☐ 사업내용 : 숙박시설, 편익시설, 위생시설, 체험교육시설 등
- ☐ 시행기관 : 진안군

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업              | 구분 | 계      | 22년 | 23년   | 24년   | 25년   | 26년   | 임기후 |
|-------------------|----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 계                 |    | 12,000 | 0   | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 0   |
| 군립<br>자연휴양림<br>조성 | 국비 | 0      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |
|                   | 도비 | 6,000  | 0   | 500   | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0   |
|                   | 군비 | 6,000  | 0   | 500   | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0   |
|                   | 기타 | 0      | 0   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   |

#### 4 연도별 추진계획 및 목표

| 구 분  |     | 추진계획                            | 목표(%) |
|------|-----|---------------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 사전입지조사 용역 및 자연휴양림 지정고시        | 20    |
| 2023 | 상반기 | · 기본계획 및 실시설계 수립, 토지교환(국유림↔군유림) | 40    |
|      | 하반기 | · 자연휴양림 조성계획 승인                 | 50    |
| 2024 | 상반기 | · 사업 착공 및 시행                    | 60    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                         | 70    |
| 2025 | 상반기 | · 사업 시행                         | 80    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                         | 90    |
| 2026 | 상반기 | · 사업 준공                         | 100   |
|      | 하반기 | · 자연휴양림 홍보 및 운영                 |       |
| 임기후  |     |                                 |       |

#### 5 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적  | 달성률(%) |
|------|-----|---|--------|
| 2022 | 하반기 | · 사전입지조사 용역 완료<br>· 자연휴양림 지정 신청(군수 제출 ⇒ 도지사 경유 ⇒ 산림청장 제출) | 20     |
| 2023 | 상반기 | · 자연휴양림 지정 · 고시(산림청)                                      | 20     |

#### 6 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업              | 구분 | 계     | 22년 | 23년   | 24년 | 25년 | 26년 |
|-------------------|----|-------|-----|-------|-----|-----|-----|
| 계                 |    | 1,040 | 40  | 1,000 | 0   | 0   | 0   |
| 군립<br>자연휴양림<br>조성 | 국비 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   |
|                   | 도비 | 500   | 0   | 500   | 0   | 0   | 0   |
|                   | 군비 | 540   | 40  | 500   | 0   | 0   | 0   |
|                   | 기타 | 0     | 0   | 0     | 0   | 0   | 0   |

## 8

## 향후 추진계획

---

- 자연휴양림 기본 및 실시설계 수립, 개별법 인·허가 절차 이행 : '23. 5. ~ 12.
- 자연휴양림 사업부지 내 국유림과 군유림 교환 절차 이행 : '24. 1. ~ 12.
- 자연휴양림 조성계획 승인 및 사업시행 : '24. 1. ~ '26. 6.

## 진안고원 지방정원 조성

|                      |                                     |       |           |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 산림과(산림정책)<br>팀 장 : 최건호<br>담당자 : 함미진 | 사업구분  | 임기 내      | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. ~ 2026. 6.                    | 소요예산  | 40,000백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 15%       |     |    |

## 1 공약 최종목표

○ 정원문화와 산업육성을 위한 명품 지방정원(1개소) 조성·운영

## 2 사업개요

- ☐ 사업기간 : 2022. ~ 2026. 6.
- ☐ 위 치 : 진안군 진안읍 운산리 인공습지 일원
- ☐ 사 업 비 : 400억원(도비 50%, 군비 50%)
- ☐ 사업내용 : 5종 이상의 주제정원, 방문자센터, 편의시설, 체험시설 등
- ☐ 시행기관 : 진안군

## 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업       | 구분 | 계      | 22년 | 23년 | 24년    | 25년    | 26년    | 임기후 |
|------------|----|--------|-----|-----|--------|--------|--------|-----|
| 계          |    | 40,000 | 0   | 0   | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 0   |
| 지방정원<br>조성 | 국비 | 0      | 0   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0   |
|            | 도비 | 20,000 | 0   | 0   | 7,000  | 7,000  | 6,000  | 0   |
|            | 군비 | 20,000 | 0   | 0   | 7,000  | 7,000  | 6,000  | 0   |
|            | 기타 | 0      | 0   | 0   | 0      | 0      | 0      | 0   |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

| 구 분  |     | 추진계획                           | 목표(%) |
|------|-----|--------------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 사업대상지 변경                     | 10    |
| 2023 | 상반기 | · 기본구상용역(타당성평가)                | 20    |
|      | 하반기 | · 기본구상용역(타당성평가)                | 30    |
| 2024 | 상반기 | · 토지매입 및 행정절차 이행, 기본 및 실시설계 용역 | 40    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                        | 50    |
| 2025 | 상반기 | · 사업 시행                        | 70    |
|      | 하반기 | · 사업 시행                        | 90    |
| 2026 | 상반기 | · 사업 준공, 홍보 및 운영               | 100   |
|      | 하반기 |                                |       |
| 임기후  |     | · 국가정원 승격                      |       |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적                  | 달성률(%) |
|------|-----|-----------------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 사업대상지 변경            | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수 | 15     |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업    | 구분 | 계  | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 계       |    | 50 | 0   | 50  | 0   | 0   | 0   |
| 지방정원 조성 | 국비 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|         | 도비 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|         | 군비 | 50 | 0   | 50  | 0   | 0   | 0   |
|         | 기타 | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

**8****향후 추진계획**

---

- 지방정원 기본구상용역 추진 : '23. 5. ~ 12.
- 지방정원 전문가 포럼 및 주민설명회 : '23. 5. ~ 9.
- 지방정원 토지매입 및 행정절차 이행 : '24. 1. ~ 12.
- 지방정원 기본 및 실시설계 용역 및 사업시행 : '24. 1. ~ '26. 6.



| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 관광과(관광개발)<br>팀 장 : 장서옥<br>담당자 : 권아영 | 사업구분  | 임기 내     | 유 형 | 신규 |
|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|-----|----|
| 사업기간                 | 2022. 7. ~ 2026. 6.                 | 소요예산  | 6,550백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 41%      |     |    |

## 1 공약 최종목표

- 금강~마이산~섬진강을 연계하는 진안 힐링휴양 관광벨트 구축

## 2 사업개요

### □ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 용담호 권역
- 내 용 : 금강(용담호)권역 드라이브 코스 개발 (용담호 주변 휴게소 정비 포함)
  - 테마별 드라이브 코스 개발 (예> 바이크 힐링로드, 차박 힐링로드, 생태 힐링로드)
  - 테마별 휴게소 리모델링
    - 용평 쉼터 : 진안고원길 여행자 센터
    - 월포휴게소 : 바이크 라이더들의 휴식공간
    - 삼락 쉼터 : 무인카페, 관광안내, 포토존 등
    - 옥거 쉼터 : 문화예술공간, 산책로, 관광안내
    - 와룡 쉼터 : 차박지 조성

### □ 섬진강권역 콘텐츠 개발 및 관광자원화 사업 추진

- 사업기간 : 2023. ~ 2023.
- 장 소 : 섬진강 권역
- 사 업 비 : 1,250백만원(군비 1,250)
- 내 용 : 섬진강 권역 분포되어있는 관광자원의 활용을 위한 콘텐츠 개발
  - 섬진강 권역 관광자원을 활용한 치유 관광자원화
  - 섬진강 문류(文流)길 조성

### □ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2023.
- 장 소 : 부귀면 세동리 일원
- 사 업 비 : 2,000백만원 (도비 1,500, 군비 500)
- 내 용 : 감성관광 인프라 및 편의시설 개선, 수용태세 개선

### □ 풍혈냉천 정비사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2022.
- 장 소 : 성수면 풍혈냉천
- 사 업 비 : 100백만원 (군비 100)
- 내 용 : 바람길 정비 (기존 옹벽 철거 및 석축쌓기), 가로등 설치 등

## 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                            | 구분 | 계     | 22년   | 23년   | 24년   | 25년 | 26년 | 임기후 |
|---------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 합 계                             | 계  | 6,550 | 1,400 | 1,650 | 1,700 | 800 | 100 | 900 |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 | 1,500 | 900   | 600   | 0     | 0   | 0   | 0   |
|                                 | 군비 | 5,050 | 500   | 1,050 | 1,700 | 800 | 100 | 900 |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |
| 금강(용담호) 권역<br>드라이브코스<br>개발      | 소계 | 3,200 | 100   | 800   | 1,600 | 700 |     |     |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 3,200 | 100   | 800   | 1,600 | 700 |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |
| 섬진강권역<br>콘텐츠<br>개발용역            | 소계 | 1,250 |       | 50    | 100   | 100 | 100 | 900 |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 1,250 |       | 50    | 100   | 100 | 100 | 900 |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |
| 부귀<br>메타세쿼이아길<br>관광자원화<br>사업 추진 | 소계 | 2,000 | 1,200 | 800   |       |     |     |     |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 | 1,500 | 900   | 600   |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 500   | 300   | 200   |       |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |
| 풍혈냉천<br>정비사업                    | 소계 | 100   | 100   |       |       |     |     |     |
|                                 | 국비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 100   | 100   |       |       |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |       |     |     |     |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

## □ 용담호(금강) 권역 드라이브 코스 개발

| 구 분  | 추진계획   | 목표(%) |
|------|--|-------|
| 2022 | 하반기 · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 착공                           | 10    |
| 2023 | 상반기 · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 완료<br>· 옥거 쉼터, 용평 쉼터 리모델링 착공 | 20    |
|      | 하반기 · 옥거 쉼터, 용평 쉼터 리모델링 완료   | 60    |
| 2024 | 상반기 · 와룡 쉼터, 월포 휴게소 리모델링 착공  | 70    |
|      | 하반기 · 와룡 쉼터, 월포 휴게소 리모델링 완료  | 80    |
| 2025 | 상반기 · 노성 휴게소 리모델링 착공   | 90    |
|      | 하반기 · 노성 휴게소 리모델링 완료   | 100   |

## □ 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 추진

| 구 분  | 추진계획                               | 목표(%) |
|------|------------------------------------|-------|
| 2023 | 상반기 · 콘텐츠 개발용역 착수                  | 10    |
|      | 하반기 · 콘텐츠 개발용역 완료                  | 30    |
| 2024 | 상반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 추진    | 40    |
|      | 하반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(1차분) 완료    | 50    |
| 2025 | 상반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 설계 추진 | 60    |
|      | 하반기 · 콘텐츠 개발에 따른 연차별 사업(2차분) 완료    | 70    |
| 2026 | 상반기 · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 착수  | 80    |
|      | 하반기 · 섬진강 문류(文流)길 조성 기본 및 실시설계 완료  | 90    |
| 임기후  | · 행정절차 이행 및 섬진강 문류(文流)길 조성 추진      | 100   |

## □ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

| 구 분  | 추진계획                        | 목표(%) |
|------|-----------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 · 실시설계용역 완료, 사업 착수(1차분) | 30    |
| 2023 | 상반기 · 사업 착수(2차분)            | 60    |
|      | 하반기 · 사업 완료(1차분, 2차분)       | 100   |

## □ 중혈냉천 정비사업

| 구 분  | 추진계획                    | 목표(%) |
|------|-------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 · 정비사업 완료('22. 11.) | 100   |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

## □ 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발

| 구 분  |     | 추진실적   | 달성률(%) |
|------|-----|--|--------|
| 2022 | 하반기 | · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 착공   | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 용담호 주변 휴게소 및 활성화 시범사업 1개소(삼락쉼터) 추진<br>· 옥거쉼터 리모델링 실시설계용역 착수<br>· 용평쉼터 리모델링 실시설계용역 착수 | 15     |

## □ 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 추진

| 구 분  |     | 추진실적                | 달성률(%) |
|------|-----|---------------------|--------|
| 2023 | 상반기 | · 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 착수 | 10     |

## □ 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업

| 구 분  |     | 추진실적  | 달성률(%) |
|------|-----|---|--------|
| 2022 | 하반기 | · 실시설계용역 완료 및 원가심사 등 행정절차 이행<br>· 1차분 사업 착수 | 30     |
| 2023 | 상반기 | · 1차분 사업 추진<br>· 2차분 사업 착수예정(6월 중)          | 40     |

## □ 풍혈냉천 정비사업

| 구 분  |     | 추진실적                | 달성률(%) |
|------|-----|---------------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 정비사업 완료('22. 11.) | 100    |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업                            | 구분 | 계     | 22년   | 23년   | 24년 | 25년 | 26년 |
|---------------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 계                               |    | 3,200 | 1,550 | 1,650 |     |     |     |
| 금강(용담호) 권역<br>드라이브코스<br>개발      | 국비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 1,050 | 250   | 800   |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |     |     |     |
| 섬진강권역<br>콘텐츠<br>개발용역            | 국비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 50    | -     | 50    |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |     |     |     |
| 부귀<br>메타세쿼이아길<br>관광자원화<br>사업 추진 | 국비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 | 1,500 | 900   | 600   |     |     |     |
|                                 | 군비 | 500   | 300   | 200   |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |     |     |     |
| 풍혈냉천<br>정비사업                    | 국비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 도비 |       |       |       |     |     |     |
|                                 | 군비 | 100   | 100   |       |     |     |     |
|                                 | 기타 |       |       |       |     |     |     |

## 7

## 향후 추진계획

- 금강(용담호) 권역 드라이브 코스 개발
  - 용담호 휴게소(옥거, 용평쉼터) 리모델링 설계용역 완료 : 2023. 5.한
  - 용담호 휴게소(삼락쉼터) 리모델링 완료 : 2023. 6.한
  - 용담호 휴게소(옥거, 용평쉼터) 리모델링 착수 : 2023. 6.한
- 섬진강권역 콘텐츠 개발용역
  - 섬진강권역 콘텐츠 개발용역 완료 : 2023. 9.한
  - 연차별 사업 추진 : 2024. ~
- 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업
  - 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업(1차분) 준공 : 2023. 6.한
  - 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업(2차분) 착공 : 2023. 6.한
  - 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업(2차분) 준공 : 2023. 12.한

## 착 공 계

공 사 명: 용담호변 포토존 조성사업  
 계약 금액: 일금 일억사천사백칠십삼만이천오백 원정 ( W144,732,500)  
 계약 년월일: 2022 년 11 월 29 일  
 착공 년월일: 2022 년 11 월 30 일  
 계약 준공일: 2023 년 2 월 27 일

상기 공사에 대하여 하기 서류 첨부하여 착공계를 제출 합니다.

## 첨 부 서 류

- 1.예정공정표
- 2.현장대리인계
- 3.건설기술자면허(사본)
- 4.재직증명서
- 5.내역서

2022 년 11 월 30 일

주 소 : 전라북도 진안군 정천면 상초윗길 4-7  
 상 호 : ( 유 ) 이 안 건 설  
 대 표 : 정 경 환 (인)

진 안 군 재 무 관 귀하



## 삼락센터 리모델링사업 착공계 접수

## 삼락센터 리모델링사업 착공(22.12.현황)

## 착 수 계

1. 계약 건 명 : 용담호주변 센터(용평센터) 시설개선사업 설계용역
2. 계약 금 액 : 금 이천오백삼십삼만오백육십원(금 25,330,560원)
3. 계약 년 월 일 : 2023년 02월 08일
4. 착 수 년 월 일 : 2023년 02월 09일
5. 준 공 년 월 일 : 2023년 05월 09일

상기와 같이 착수하고자 착수계를 제출합니다.

- \*붙임 : 1. 예정공정표  
 2. 보안각서  
 3. 책임기술자 신고서  
 4. 내역서

2023년 02월 09일

회사명 : 아진건축사사무소  
 주 소 : 전북 진안군 진안읍 우화산길 9 2층  
 대표자 : 김 중 현 (인)

진안군 재무관 귀하

## 착 수 계

용 역 명 : 용담호주변 센터(옥거센터) 시설개선사업 설계용역  
 계약 금 액 : 금 38,200,000원(금삼천팔백이십만원)  
 계약 년 월 일 : 2023년 2월 27일  
 착 수 년 월 일 : 2023년 3월 6일  
 납 품 예 정 일 : 2023년 6월 3일

상기와 같이 설계용역을 착수하였기에 착수계를 제출합니다.

2023년 3월 6일

주 소 : 전북 완주군 삼례읍 삼봉로 11-2 (2층)  
 상 호 : 유 리 재 건 축 사 사 무 소  
 대 표 자 : 신 명 회 (인)

진안군재무관 귀하

## 용평센터 리모델링 실시설계용역 착수계 접수

## 옥거센터 리모델링 실시설계용역 착수계 접수



## 착 공 신 고 서

책임건설사업관리인 경우 :  (인)

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 공 사 명       | 부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업               |
| 공 사 위 치     | 진안군 부귀면 세동리 69-3                 |
| 공 사 금 액     | 일금칠억육천삼백구십만원정 (₩763,900,000)     |
| 전 체 분 금 액   | 일금일십억삼십삼만오천구백원정 (₩1,000,335,900) |
| 계 약 년 월 일   | 2022년 12월 23일                    |
| 착 공 년 월 일   | 2022년 12월 27일                    |
| 금 차 분 준 공 일 | 2023년 07월 24일                    |
| 전 체 분 준 공 일 | 2023년 12월 21일                    |

상기와 같이 착공 신고서를 제출합니다.

2022년 12월 27일


주 소 : 전북 전주시 완산구 흥산남로 19, 3층

상 호 : 더신한 유탄회사

대표이사 : 박 진 영



전라북도 진안군 귀하

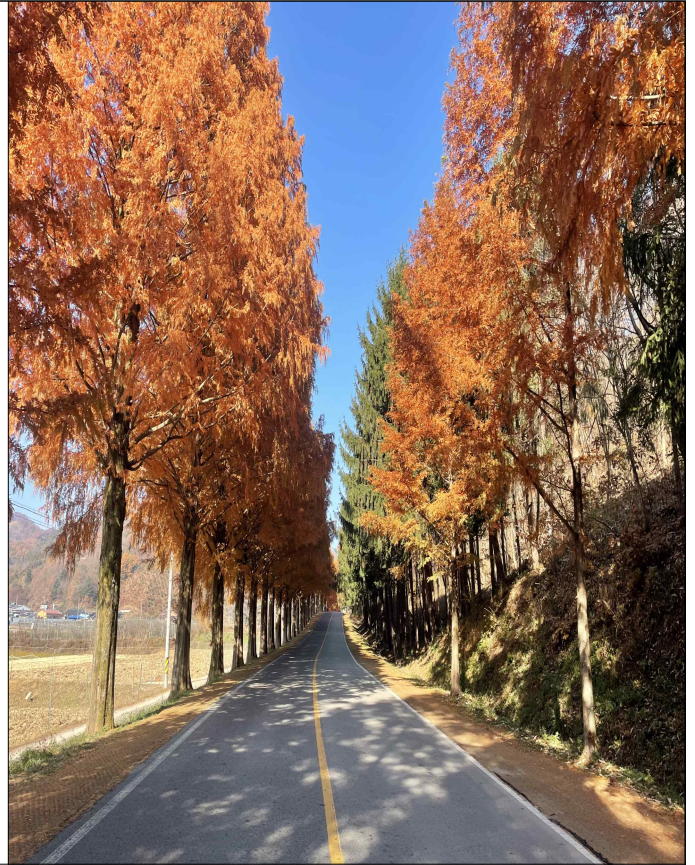

부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업(1차분) 착공계 접수

부귀 메타세쿼이아길 관광자원화사업 착공('22. 12.)



풍혈냉천 정비사업완료



풍혈냉천 정비사업완료

## 마이산과 용담호를 연결하는 “마이동천 탐방로” 조성

|                      |  |       |          |     |    |
|----------------------|--|-------|----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 관광과(관광개발)<br>팀 장 : 장서옥<br>담당자 : 채다아, 박보람 | 사업구분  | 임기 내     | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 7. ~ 2026. 6.                      | 소요예산  | 8,600백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                     | 이 행 른 | 10%      |     |    |

### 1 공약 최종목표

- 진안군 대표 관광지인 마이산과 용담호를 연결하는 관광콘텐츠 개발로 관광 경쟁력 강화

### 2 사업개요

#### ☐ 마이산 북부 ~ 언건습지 탐방로 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- 장 소 : 마이산 북부 ~ 운산습지 ~ 언건습지
- 사 업 비 : 200백만원 (도비 100, 군비 100)
- 내 용 : 기존 자전거 도로 정비

#### ☐ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 장 소 : 용담호 주변 (용담댐 물문화관 ~ 안천 신지천 인공습지 ~ 언건습지)
- 사 업 비 : 8,400백만원 (국비 4,200, 군비 4,200)
- 내 용
  - 1단계 (2023~2025) : 40억 (용담댐 물문화관 ~ 안천 신지천 인공습지)
  - 2단계 (2026~2028) : 22억 (안천 신지천 습지 ~ 상전 망향의 동산)
  - 3단계 (2028~2030) : 22억 (상전 망향의 동산 ~ 언건습지)



## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                         | 구분 | 계     | 22년 | 23년 | 24년   | 25년   | 26년 | 임기후   |
|------------------------------|----|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-------|
| 합 계                          | 계  | 8,600 |     | 300 | 2,100 | 1,800 | 200 | 4,200 |
|                              | 국비 | 4,200 |     | 100 | 1,000 | 900   | 100 | 2,100 |
|                              | 도비 | 100   |     | 100 |       |       |     |       |
|                              | 군비 | 4,300 |     | 100 | 1,100 | 900   | 100 | 2,100 |
|                              | 기타 |       |     |     |       |       |     |       |
| 마이산<br>북부~<br>언건습지<br>탐방로 조성 | 소계 | 200   |     | 100 | 100   |       |     |       |
|                              | 국비 |       |     |     |       |       |     |       |
|                              | 도비 | 100   |     | 100 |       |       |     |       |
|                              | 군비 | 100   |     |     | 100   |       |     |       |
|                              | 기타 |       |     |     |       |       |     |       |
| 용담호<br>생명수<br>생태탐방로<br>조성    | 소계 | 8,400 |     | 200 | 2,000 | 1,800 | 200 | 4,200 |
|                              | 국비 | 4,200 |     | 100 | 1,000 | 900   | 100 | 2,100 |
|                              | 도비 |       |     |     |       |       |     |       |
|                              | 군비 | 4,200 |     | 100 | 1,000 | 900   | 100 | 2,100 |
|                              | 기타 |       |     |     |       |       |     |       |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

## □ 마이산 북부~언건습지 탐방로 조성

| 구 분  |     | 추진계획                         | 목표(%) |
|------|-----|------------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 마이산 북부~언건습지 탐방로 정비계획 수립    | 5     |
| 2023 | 상반기 | · 로터리 ~ 마이산 북부 탐방로 정비 실시설계용역 | 20    |
|      | 하반기 | · 로터리 ~ 마이산 북부 탐방로 정비 사업 완료  | 40    |
| 2024 | 상반기 | · 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진       | 50    |
|      | 하반기 | · 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진       | 60    |
| 2025 | 상반기 | · 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 추진       | 80    |
|      | 하반기 | · 로터리 ~ 언건습지 탐방로 정비 완료       | 100   |

☐ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

| 구 분  |     | 추진계획                   | 목표(%) |
|------|-----|------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 국가 생태 탐방로 공모사업 추진    | 10    |
| 2023 | 상반기 | · 1단계 사업 기본계획 수립       | 15    |
|      | 하반기 | · 1단계 사업 설계용역 추진       | 20    |
| 2024 | 상반기 | · 1단계 사업 착수            | 30    |
|      | 하반기 | · 1단계 사업 추진            | 40    |
| 2025 | 상반기 | · 1단계 사업 추진            | 60    |
|      | 하반기 | · 1단계 사업 완료            | 80    |
| 2026 | 상반기 | · 2단계 사업 구상(안) 수립      | 100   |
| 임기후  |     | · 2단계 사업 추진, 3단계 사업 추진 |       |

**5 연도별 추진실적 및 달성률**

☐ 마이산 북부~언건습지 탐방로 조성

| 구 분  |     | 추진실적                                  | 달성률(%) |
|------|-----|---------------------------------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 마이산 북부 ~ 언건습지 탐방로 정비계획 수립(`22. 12.) | 5      |
| 2023 | 상반기 | · 실시설계용역 착수(`23. 2.)                  | 10     |

☐ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

| 구 분  |     | 추진실적                            | 달성률(%) |
|------|-----|---------------------------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 국가 생태탐방로 공모사업 선정(`22. 9. 27.) | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 기본계획 수립용역 발주(`23. 2.)         | 10     |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업                      | 구분 | 계   | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | 임기후 |
|---------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 합 계                       | 계  | 400 |     | 400 |     |     |     |     |
|                           | 국비 | 150 |     | 150 |     |     |     |     |
|                           | 도비 | 100 |     | 100 |     |     |     |     |
|                           | 군비 | 150 |     | 150 |     |     |     |     |
|                           | 기타 |     |     |     |     |     |     |     |
| 마이산 북부~<br>언건습지<br>탐방로 조성 | 소계 | 100 |     | 100 |     |     |     |     |
|                           | 국비 |     |     |     |     |     |     |     |
|                           | 도비 | 100 |     | 100 |     |     |     |     |
|                           | 군비 |     |     |     |     |     |     |     |
|                           | 기타 |     |     |     |     |     |     |     |
| 용담호<br>생명수<br>생태탐방로<br>조성 | 소계 | 300 |     | 300 |     |     |     |     |
|                           | 국비 | 150 |     | 150 |     |     |     |     |
|                           | 도비 |     |     |     |     |     |     |     |
|                           | 군비 | 150 |     | 150 |     |     |     |     |
|                           | 기타 |     |     |     |     |     |     |     |

## 7

## 향후 추진계획

☐ 마이산 북부~언건습지 탐방로 정비사업

- 1차분\* 실시설계용역 추진 \* 마이산 북부~진안읍 로터리 : 2023. 1. ~ 5.
- 1차분 사업 완료 : 2023. 5. ~ 12.
- 2차분\* 사업 추진 \* 진안읍 로터리~언건습지 : 2024. 1. ~ 12.

☐ 용담호 생명수 생태탐방로 조성

- 1단계 사업 기본계획 수립 및 설계용역 추진 : 2023. 4. ~ 12.
- 1단계 사업 추진 : 2024. 1. ~ 2025. 12.

## 마이산 남·북부 연결 체계 구축

|                      |                                     |       |          |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 관광과(관광개발)<br>팀 장 : 장서옥<br>담당자 : 김봉철 | 사업구분  | 임기 내     | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 7. ~ 2026. 6.                 | 소요예산  | 5,450백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 9%       |     |    |

### 1 공약 최종목표

- 마이산 남북부의 차별화된 관광 콘텐츠를 공간의 단절 없이 자유롭게 즐길 수 있는 최적의 연결체계 구축으로 관광 경쟁력 강화

### 2 사업개요

#### □ 마이산 남·북부 연결 체계 구축

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안읍 단양리 ~ 마령면 동촌리
- 총사업비 : 5,450백만원
- 내 용 : 마이산 남·북부 연결 체계 구축

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                      | 구분 | 계     | 22년 | 23년 | 24년 | 25년   | 26년   | 임기후 |
|---------------------------|----|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 마이산<br>남·북부<br>연결체계<br>구축 | 계  | 5,450 | 50  | 100 | 300 | 2,500 | 2,500 |     |
|                           | 국비 |       |     |     |     |       |       |     |
|                           | 도비 |       |     |     |     |       |       |     |
|                           | 군비 | 5,450 | 50  | 100 | 300 | 2,500 | 2,500 |     |
|                           | 기타 |       |     |     |     |       |       |     |

## 4 연도별 추진계획 및 목표

| 구 분  |     | 추진계획                          | 목표(%) |
|------|-----|-------------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 마이산 남·북부 연결 타당성 조사용역 완료     | 10    |
| 2023 | 상반기 | · 마이산 남·북부 연결 체계 기본계획 수립용역 착수 | 15    |
|      | 하반기 | · 마이산 남·북부 연결 체계 기본계획 수립용역 완료 | 20    |
| 2024 | 상반기 | · 실시설계용역 착수                   | 25    |
|      | 하반기 | · 실시설계용역 완료, 행정절차 이행 완료       | 40    |
| 2025 | 상반기 | · 사업 착수                       | 60    |
|      | 하반기 | · 사업 추진                       | 80    |
| 2026 | 상반기 | · 사업 완료                       | 100   |
| 임기후  |     |                               |       |

## 5 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적  | 달성률(%) |
|------|-----|---|--------|
| 2022 | 하반기 | · 마이산 남·북부 연결 구상안 도출<br>· 관광객, 공무원, 마이회, 군민 설문조사 완료 | 8      |
| 2023 | 상반기 | · 용역 중간보고<br>· 노선 및 이동수단(안) 구상<br>· 문화재청 방문 의견 청취   | 9      |

## 6 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업                          | 구분 | 계  | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
|-------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 계                             |    | 50 | 50  | -   |     |     |     |
| 마이산<br>남·북부<br>연결 타당성<br>조사용역 | 국비 | -  | -   | -   |     |     |     |
|                               | 도비 | -  | -   | -   |     |     |     |
|                               | 군비 | 50 | 50  | -   |     |     |     |
|                               | 기타 | -  | -   | -   |     |     |     |

## 7

## 향후 추진계획

- 환경청 방문 의견 청취 : 2023. 4.
- 마이산 남북부 연결 노선 및 이동수단 확정 : 2023. 5.
- 행정절차\* 이행 : 2023. 12.
- \* 마이산 도립공원 공원계획 변경, 문화재 현상변경 심의 등
- 사업 추진 : 2024. ~ 2026.

## 체류형 관광을 위한 다양한 체험 및 숙박시설 조성

|                      |                                     |       |           |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 관광과(관광개발)<br>팀 장 : 장서옥<br>담당자 : 김봉철 | 사업구분  | 임기 내      | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 8. ~ 2026. 6.                 | 소요예산  | 31,300백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 률 | 15%       |     |    |

### 1 공약 최종목표

○ 다양한 체험기회 제공과 숙박시설 조성으로 체류형 관광 목적지 조성

### 2 사업개요

#### ☐ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 마이산 북부 일원
- 사 업 비 : 10,000백만원 (도비 5,000, 군비 5,000)
- 내 용 : 4가지 테마(감성, 열정, 활력, 관계) 체험 콘텐츠존 조성

#### ☐ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트 추진

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 장 소 : 진안 국가지질공원 일원
- 사 업 비 : 2,600백만원 (국비 2,000, 군비 600)
- 내 용 : 지오향스 조성 (게스트하우스, 캠핑장 등)

#### ☐ 진안고원 마이스테이 조성

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 진안읍 단양리 마이산 북부 일원
- 사 업 비 : 15,700백만원 (국비 15,000, 군비 700)
- 내 용 : 숙박시설 50객실, 세미나실, 힐링센터, 편의시설 등 조성

## □ 윤일암반일암 테마공원 조성사업

- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 장 소 : 주천면 윤일암반일암
- 사 업 비 : 3,000백만원 (도비 2,250, 군비 750)
- 내 용 : 금강 지류인 주자천을 활용한 테마공원 조성

### 3

### 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                         | 구분 | 계      | 22년 | 23년   | 24년   | 25년   | 26년   | 임기후 |
|------------------------------|----|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|
| 합 계                          | 계  | 31,300 | 900 | 8,000 | 5,400 | 7,800 | 9,200 |     |
|                              | 국비 | 17,000 | 500 | 1,300 | 2,500 | 5,500 | 7,200 |     |
|                              | 도비 | 7,250  | 250 | 3,550 | 1,450 | 1,000 | 1,000 |     |
|                              | 군비 | 7,050  | 150 | 3,150 | 1,450 | 1,300 | 1,000 |     |
|                              | 기타 |        |     |       |       |       |       |     |
| 마이산<br>4색 에너지<br>충전소<br>조성사업 | 소계 | 10,000 | 200 | 3,800 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |     |
|                              | 국비 |        |     |       |       |       |       |     |
|                              | 도비 | 5,000  | 100 | 1,900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |     |
|                              | 군비 | 5,000  | 100 | 1,900 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |     |
|                              | 기타 |        |     |       |       |       |       |     |
| 지오프랜드<br>탐사일주여행<br>프로젝트      | 소계 | 2,600  | 300 | 700   | 800   | 800   |       |     |
|                              | 국비 | 2,000  | 300 | 700   | 500   | 500   |       |     |
|                              | 도비 |        |     |       |       |       |       |     |
|                              | 군비 | 600    |     |       | 300   | 300   |       |     |
|                              | 기타 |        |     |       |       |       |       |     |
| 진안고원<br>마이스테이<br>조성          | 소계 | 15,700 | 200 | 1,300 | 2,000 | 5,000 | 7,200 |     |
|                              | 국비 | 15,000 | 200 | 600   | 2,000 | 5,000 | 7,200 |     |
|                              | 도비 |        |     |       |       |       |       |     |
|                              | 군비 | 700    |     | 700   |       |       |       |     |
|                              | 기타 |        |     |       |       |       |       |     |
| 윤일암<br>반일암<br>테마공원<br>조성사업   | 소계 | 3,000  | 200 | 2,200 | 600   |       |       |     |
|                              | 국비 |        |     |       |       |       |       |     |
|                              | 도비 | 2,250  | 150 | 1,650 | 450   |       |       |     |
|                              | 군비 | 750    | 50  | 550   | 150   |       |       |     |
|                              | 기타 |        |     |       |       |       |       |     |



## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

## □ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

| 구 분  |     | 추진계획   | 목표(%) |
|------|-----|--|-------|
| 2022 | 하반기 | · 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 착수                        | 5     |
| 2023 | 상반기 | · 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 완료                        | 20    |
|      | 하반기 | · 1단계(감성, 열정) 사업 착수                            | 30    |
| 2024 | 상반기 | · 1단계(감성, 열정) 사업 추진<br>· 2단계(활력, 관계) 실시설계용역 착수 | 45    |
|      | 하반기 | · 1단계(감성, 열정) 사업 완료<br>· 2단계(활력, 관계) 실시설계용역 완료 | 60    |
| 2025 | 상반기 | · 2단계(활력, 관계) 사업 착수                            | 75    |
|      | 하반기 | · 2단계(활력, 관계) 사업 추진                            | 90    |
| 2026 | 상반기 | · 2단계(활력, 관계) 사업 완료                            | 100   |
| 임기후  |     | · 마이산 4색 에너지 충전소 운영자 선정 및 개관                   |       |

## □ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트

| 구 분  |     | 추진계획        | 목표(%) |
|------|-----|-------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 실시설계용역 착수 | 10    |
| 2023 | 상반기 | · 실시설계용역 완료 | 20    |
|      | 하반기 | · 사업 착수     | 30    |
| 2024 | 상반기 | · 사업 추진     | 40    |
|      | 하반기 | · 사업 추진     | 60    |
| 2025 | 상반기 | · 사업 추진     | 80    |
|      | 하반기 | · 사업 완료     | 100   |

□ **진안고원 마이스테이 조성**

| 구 분  |     | 추진계획                           | 목표(%) |
|------|-----|--------------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 기본계획 수립용역 착수                 | 10    |
| 2023 | 상반기 | · 토지매입 등 행정절차 이행               | 20    |
|      | 하반기 | · 실시설계 착수                      | 30    |
| 2024 | 상반기 | · 실시설계 완료                      | 40    |
|      | 하반기 | · 원가심사, 건축허가 등 행정절차 이행 및 사업 착수 | 55    |
| 2025 | 상반기 | · 사업 추진                        | 70    |
|      | 하반기 | · 사업 추진                        | 85    |
| 2026 | 상반기 | · 사업 완료                        | 100   |
|      | 하반기 | · 운영자 선정 및 개관                  |       |

□ **운일암반일암 테마공원 조성사업**

| 구 분  |     | 추진계획        | 목표(%) |
|------|-----|-------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 실시설계용역 완료 | 20    |
| 2023 | 상반기 | · 사업 착수     | 30    |
|      | 하반기 | · 사업 추진     | 50    |
| 2024 | 상반기 | · 사업 추진     | 70    |
|      | 하반기 | · 사업 완료     | 100   |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

## □ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

| 구 분  |     | 추진실적                                      | 달성률(%) |
|------|-----|---|--------|
| 2022 | 하반기 | · 기본계획 수립용역 완료<br>· 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 착수 | 5      |
| 2023 | 상반기 | · 1단계(감성, 열정) 실시설계용역 추진                   | 10     |

## □ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트

| 구 분  |     | 추진실적                    | 달성률(%) |
|------|-----|-------------------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 지역개발구역 지정 및 실시설계용역 착수 | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 지역개발구역 지정 및 실시설계용역 추진 | 15     |

## □ 진안고원 마이스테이 조성

| 구 분  |     | 추진실적           | 달성률(%) |
|------|-----|----------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 기본계획 수립용역 착수 | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 토지매입 완료      | 20     |

## □ 윤일암반일암 테마공원 조성사업

| 구 분  |     | 추진실적        | 달성률(%) |
|------|-----|-------------|--------|
| 2022 | 하반기 | · 실시설계용역 착수 | 10     |
| 2023 | 상반기 | · 실시설계용역 추진 | 15     |

| 세부사업                         | 구분 | 계     | 22년   | 23년   | 24년 | 25년 | 26년 |
|------------------------------|----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 합 계                          | 계  | 9,145 | 1,060 | 8,085 | 0   | 0   | 0   |
|                              | 국비 | 895   | 410   | 485   | 0   | 0   | 0   |
|                              | 도비 | 3,800 | 250   | 3,550 | 0   | 0   | 0   |
|                              | 군비 | 3,650 | 200   | 3,450 | 0   | 0   | 0   |
|                              | 기타 | 800   | 200   | 600   | 0   | 0   | 0   |
| 마이산<br>4색 에너지<br>충전소<br>구성사업 | 소계 | 4,000 | 200   | 3,800 | 0   | 0   | 0   |
|                              | 국비 | 0     |       |       |     |     |     |
|                              | 도비 | 2,000 | 100   | 1,900 |     |     |     |
|                              | 군비 | 2,000 | 100   | 1,900 |     |     |     |
|                              | 기타 | 0     |       |       |     |     |     |
| 지오프랜드<br>탐사일주여행<br>프로젝트      | 소계 | 945   | 460   | 485   | 0   | 0   | 0   |
|                              | 국비 | 895   | 410   | 485   |     |     |     |
|                              | 도비 | 0     |       |       |     |     |     |
|                              | 군비 | 50    | 50    |       |     |     |     |
|                              | 기타 | 0     |       |       |     |     |     |
| 진안고원<br>마이스테이<br>구성          | 소계 | 1,800 | 200   | 1,600 | 0   | 0   | 0   |
|                              | 국비 | 0     |       |       |     |     |     |
|                              | 도비 | 0     |       |       |     |     |     |
|                              | 군비 | 1,000 |       | 1,000 |     |     |     |
|                              | 기타 | 800   | 200   | 600   |     |     |     |
| 운일암반일암<br>테마공원<br>구성사업       | 소계 | 2,400 | 200   | 2,200 | 0   | 0   | 0   |
|                              | 국비 | 0     |       |       |     |     |     |
|                              | 도비 | 1,800 | 150   | 1,650 |     |     |     |
|                              | 군비 | 600   | 50    | 550   |     |     |     |
|                              | 기타 | 0     |       |       |     |     |     |

### □ 마이산 4색 에너지 충전소 조성사업

- 실시설계용역(1단계) 완료 : 2023. 6.
- 1단계 사업 추진 : 2023. 7. ~ 2024. 6.
- 2단계 사업 추진 : 2024. 7. ~ 2026. 6.

### □ 지오프랜드 탐사일주여행 프로젝트

- 지역개발구역 지정 및 실시설계용역 완료 : 2023. 10.
- 공사 착공 : 2023. 12.
- 지오프랜드 탐사일주여행 콘텐츠 개발 : 2024. 1. ~ 6.

### □ 진안고원 마이스테이 조성

- 기본계획 수립용역 완료 : 2023. 6.
- 건축 행정절차 이행(건축기획, 설계공모 등) : 2023. 6. ~ 8.
- 실시설계용역 추진 : 2023. 8. ~ 2024. 6.
- 행정절차 이행 및 사업 착수 : 2024. 7. ~ 12.
- 사업 추진 : 2025. 1. ~ 2026. 6.
- 운영자 선정 및 개관 : 2026. 10.

### □ 운일암반일암 테마공원 조성사업

- 주민의견 수렴, 용역 보고 : 2023. 1. ~ 3.
- 관련법 협의 및 인허가 등 행정절차 이행 : 2023. 4.
- 테마공원 실시설계 완료 : 2023. 6.
- 사업 착공 : 2023. 6. ~ 2024. 12.

## 진안형 메타버스 구축

|                      |                                     |       |       |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 관광과(관광정책)<br>팀 장 : 유공임<br>담당자 : 김소월 | 사업구분  | 임기 내  | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2023. 1. ~ 2026. 6.                 | 소요예산  | 80백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이 행 륜 | 30%   |     |    |

### 1 공약 최종목표

#### ○ 진안형 메타버스 구축

- 가상의 진안을 만들고 현실과 연계하는 메타버스 플랫폼을 구축하여 진안을 여행하는 새로운 체험 제공

### 2 사업개요

#### □ 메타버스 가상공간 구축

##### ○ 메타버스란?

- 가상(메타, meta) + 우주(유니버스, universe)의 합성어로 현실 세계와 같은 사회·문화 활동이 이루어지는 3차원의 가상세계
- 아바타를 기반으로 시간과 공간을 초월하여 장소를 이동하고 다양한 사람들과 소통할 수 있는 곳으로 제페토, 로블록스 등 관련 플랫폼 존재

##### ○ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2026. 6.

##### ○ 사업내용 : 진안을 미리 경험해 볼 수 있도록 관련 플랫폼(제페토\*)의 가상세계에 마이산, 산약초타운, 미로공원 등 관광지를 구축하여 관광홍보에 활용

##### ○ 이용대상 : 플랫폼 가입자

\* 제페토 : 네이버제트(네이버 계열사)가 운영하며 2018년에 출시된 증강현실(AR) 아바타 서비스로 국내 대표적인 글로벌 메타버스 플랫폼.

## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                     | 구분 | 계  | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | 임기후 |
|--------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                          | 계  | 80 | -   | 50  | 10  | 10  | 10  |     |
| 메타버스<br>플랫폼 구축<br>및 유지보수 | 국비 |    |     |     |     |     |     |     |
|                          | 도비 |    |     |     |     |     |     |     |
|                          | 군비 | 80 | -   | 50  | 10  | 10  | 10  |     |
|                          | 기타 |    |     |     |     |     |     |     |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

| 구분   | 추진계획 |                          | 목표(%) |
|------|------|--------------------------|-------|
| 2022 | 하반기  | · 플랫폼 내 구축 관광지 구상        | 10    |
| 2023 | 상반기  | · 메타버스 플랫폼 내 월드맵 구축      | 50    |
|      | 하반기  | · 메타버스 플랫폼 월드맵 운영        | 70    |
| 2024 | 상반기  | · 메타버스 플랫폼 월드맵 운영 및 유지보수 | 100   |
|      | 하반기  | · 메타버스 플랫폼 월드맵 운영 및 유지보수 |       |
| 2025 | 상반기  | · 메타버스 플랫폼 월드맵 운영 및 유지보수 |       |
|      | 하반기  | · 메타버스 플랫폼 월드맵 운영 및 유지보수 |       |
| 2026 | 상반기  | · 메타버스 플랫폼 월드맵 운영 및 유지보수 |       |
|      | 하반기  | · 메타버스 플랫폼 월드맵 운영 및 유지보수 |       |
| 임기후  |      | · 메타버스 플랫폼 월드맵 운영 및 유지보수 |       |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

| 구분   | 추진실적 |                                   | 달성률(%) |
|------|------|-----------------------------------|--------|
| 2022 | 하반기  | · 플랫폼 내 구축 관광지 구상                 | 10     |
| 2023 | 상반기  | · 메타버스(제페토) 월드맵 구축 업체 계약 및 디자인 진행 | 30     |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업                            | 구분 | 계  | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
|---------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 계                               |    | 50 | -   | 50  |     |     |     |
| 메타버스<br>플랫폼<br>월드맵 구축<br>및 유지보수 | 국비 | -  | -   | -   |     |     |     |
|                                 | 도비 | -  | -   | -   |     |     |     |
|                                 | 군비 | 50 | -   | 50  |     |     |     |
|                                 | 기타 | -  | -   | -   | -   | -   | -   |

## 7

## 향후 추진계획

- 메타버스 플랫폼 내 마이산도립공원 월드맵 구축 : 2023. 4. ~ 6.

## 8

## 관련사진



월드맵 디자인



월드맵 디자인



## 고원음식 연구 및 학술대회 추진

|                      |                                       |       |        |     |     |
|----------------------|---------------------------------------|-------|--------|-----|-----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 농촌지원과(농촌자원)<br>팀 장 : 구한결<br>담당자 : 한유선 | 사업구분  | 임기 내   | 유 형 | 계 속 |
| 사업기간                 | 2022. 8. ~ 2026. 6.                   | 소요예산  | 200백만원 |     |     |
| 이행현황                 | 정상추진                                  | 이 행 률 | 30%    |     |     |

### 1 공약 최종목표

- 진안고원 우수성 및 학문적 가치 재조명을 통한 농·특산물 홍보
- 연구 및 학술대회 추진을 통한 음식산업 기반조성 체계 구축

### 2 사업개요

#### □ 고원음식 연구 및 학술대회 추진

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 12.
- 장 소 : 진안군 일원
- 내 용
  - 진안고원 연구모임(진안고원 연구회) 조직 및 육성
  - 토론회(수시)를 통한 학술대회 주제 선정 및 학술대회 개최(연1회)
  - 진안고원의 지리적·역사적 가치 규명을 통한 음식산업 기반 조성

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                       | 구분 | 계   | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | 임기후 |
|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 고원음식<br>연구 및<br>학술대회<br>추진 | 계  | 200 | -   | 50  | 50  | 50  | 50  | -   |
|                            | 국비 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                            | 도비 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
|                            | 군비 | 200 | -   | 50  | 50  | 50  | 50  | -   |
|                            | 기타 | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -   |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

| 구 분  |     | 추진계획   | 목표(%) |
|------|-----|--|-------|
| 2022 | 하반기 | · 추진계획 수립 및 연구모임 조직                              | 20    |
| 2023 | 상반기 | · 연구지원 및 토론회(수시)<br>- 연구주제 및 발표자 선정              | 30    |
|      | 하반기 | · 고원음식 학술대회 개최                                   | 40    |
| 2024 | 상반기 | · 연구지원 및 토론회(수시)<br>- 연구주제 및 발표자 선정              | 50    |
|      | 하반기 | · 고원음식 학술대회 개최                                   | 60    |
| 2025 | 상반기 | · 연구지원 및 토론회(수시)<br>- 연구주제 및 발표자 선정              | 70    |
|      | 하반기 | · 고원음식 학술대회 개최                                   | 80    |
| 2026 | 상반기 | · 고원음식 학술대회 개최<br>- 연구참여자(2022~2025) 대상 전문가 집단토의 | 100   |
|      | 하반기 | · 지속적 추진을 위한 방안 검토                               |       |
| 임기후  |     | · 계속 추진  |       |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적  | 달성률(%) |
|------|-----|---|--------|
| 2022 | 하반기 | · 고원음식 연구 및 학술대회 추진계획 수립  | 20     |
| 2023 | 1분기 | · 진안고원음식연구회 조직 및 토론회(1회)<br>- 진안군민 및 외부전문가 포함 연구회 조직(15명)<br>· 고원음식 학술대회 수행 전문기관 및 연구자 선정 | 30     |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업                    | 구분 | 계  | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
|-------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 계                       |    | 50 | -   | 50  | -   | -   | -   |
| 고원음식<br>연구 및<br>학술대회 추진 | 국비 | -  | -   | -   | -   | -   | -   |
|                         | 도비 | -  | -   | -   | -   | -   | -   |
|                         | 군비 | 50 | -   | 50  | -   | -   | -   |
|                         | 기타 | -  | -   | -   | -   | -   | -   |



|                      |                                     |      |        |     |    |
|----------------------|-------------------------------------|------|--------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 기획홍보실(홍보)<br>팀 장 : 배상현<br>담당자 : 방재영 | 사업구분 | 임기 내   | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 7. ~ 2024. 12.                | 소요예산 | 700백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                | 이행률  | 50%    |     |    |

## 1 공약 최종목표

- 진안고원을 대내외적으로 이미지 홍보 할 수 있는 이벤트 행사 개최
  - 진안고원 브랜드를 널리 알릴 수 있는 홍보 행사 개최(1회)

## 2 사업개요

- 진안고원 브랜드 이미지 홍보 행사 개최
  - 사업기간 : 2022 ~ 2024
  - 장 소 : 관내
  - 내 용 : 진안군을 널리 알릴 수 있는 차별화된 홍보 이미지 개발  
및 진안만의 특색을 담은 다양한 홍보방안 마련으로  
공식적인 이벤트 행사를 통해 대외 홍보 추진
  - 홍보계획 수립
    - 진안고원 브랜드 홍보 기본계획 수립
    - 계획에 따른 각종 이미지화 개발 추진
      - 진안고원 브랜드 리뉴얼
      - 진안군 차별화 디자인 개발(시각, 영상, 조형물, 향기, 색 등)
      - 전략적인 진안군 홍보 비전(문구) 개발
  - 진안고원 브랜드 선포 홍보 이벤트 행사
    - 2024년 취임 2주년 또는 2024년 홍삼축제 시 이벤트 행사 추진

## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업                          | 구분 | 계   | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 | 임기후 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 진안고원<br>브랜드<br>이미지홍보<br>행사 개최 | 계  | 700 | 50  | 450 | 200 |     |     |     |
|                               | 국비 |     |     |     |     |     |     |     |
|                               | 도비 |     |     |     |     |     |     |     |
|                               | 군비 | 700 | 50  | 450 | 200 |     |     |     |
|                               | 기타 |     |     |     |     |     |     |     |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

| 구 분  |     | 추진계획                    | 목표(%) |
|------|-----|-------------------------|-------|
| 2022 | 하반기 | · 진안고원 브랜드 홍보 기본계획 수립   | 30    |
| 2023 | 상반기 | · 이미지화 개발 추진            | 50    |
|      | 하반기 | · 이미지화 개발 추진            | 70    |
| 2024 | 상반기 | · 이미지화 개발 추진            | 80    |
|      | 하반기 | · 진안고원 브랜드 선포 홍보 이벤트 행사 | 100   |
| 2025 | 상반기 | · 지속 홍보 추진              |       |
|      | 하반기 | · 지속 홍보 추진              |       |
| 2026 | 상반기 | · 지속 홍보 추진              |       |
|      | 하반기 | · 지속 홍보 추진              |       |
| 임기후  |     | · 지속 홍보 추진              |       |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적   | 달성률(%) |
|------|-----|--|--------|
| 2022 | 하반기 | · 진안고원 브랜드 홍보를 위한 기본계획 수립(자체)<br>- 진안고원 홍보 문구 정립 및 이미지화, 언론 보도자료 배포  | 20%    |
| 2023 | 상반기 | · 진안고원 브랜드 홍보를 위한 각종 이미지화 개발 추진<br>- 본청 내부 멀티비전 설치로 진안고원 이미지 및 영상 홍보<br>- 오송 KTX 역사 내 맞이방 3층 광고판 홍보<br>- 전국노래자랑 진안군편 녹화 대형 현수막 홍보 : '23. 4. 8.<br>- 진안고원 홍보 영상 유튜브 인스타그램 광고 홍보 : 15초 | 50%    |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업                          | 구분 | 계   | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
|-------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 계                             |    | 515 | 15  | 500 |     |     |     |
| 진안고원<br>홍보 문구<br>정립 및<br>이미지화 | 국비 |     |     |     |     |     |     |
|                               | 도비 |     |     |     |     |     |     |
|                               | 군비 | 515 | 15  | 500 |     |     |     |
|                               | 기타 |     |     |     |     |     |     |

## 7

## 문제점 및 대책

- 진안고원 브랜드 개발( '17년도 개발)이 얼마 되지 않아 리뉴얼 실효성 낮음
  - 진안군민 및 대내외 의견에 따라 진안고원 브랜드 리뉴얼 추진 완료 : 20. 5. 26
  - 현재 활발하게 다양한 홍보 추진 중에 있음

▣ 진안고원 브랜드 리뉴얼 추진 완료(변경)


- 기본계획 수립 용역의 다양한 홍보방안 실효성이 낮음

▣ 자체 기본계획 수립에 따른 홍보방안 구체화 추진 완료(비예산)

## 8

## 향후 추진계획

- 진안고원 브랜드 활용 다양한 이미지화 개발 및 홍보 추진
  - 다양한 매체를 활용한 옥외 홍보(4대권역 : 서울·경기, 충청, 경상, 전라)
  - SNS 홍보 추진(유튜브, 블로그, 페이스북, 인스타그램, 카카오톡 등)
- 진안고원 브랜드 홍보 알리기 선포 행사 추진 : 2024년 예정



진안고원 구체적 이미지화 및 언론사 보도 홍보




진안고원 홍보 홍보판 설치(본청)



KTX 오송역 광고판 홍보



진안고원 홍보영상 유튜브 인스트림 광고

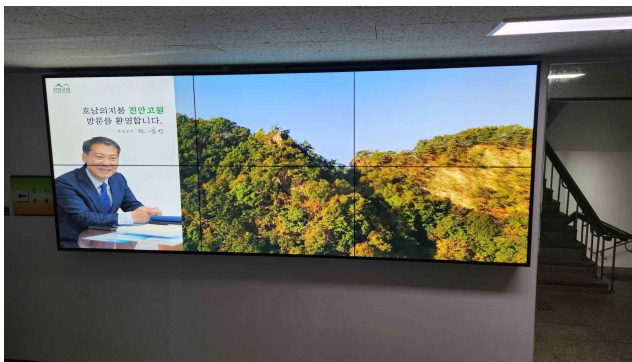

본청 내 진안고원 이미지 및 영상 홍보 멀티비전 설치



전국노래자랑 대형 현수막 홍보

## 진안 문화예술거리 조성

|                      |                                       |       |          |     |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------|----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 문화체육과(문화예술)<br>팀 장 : 유명자<br>담당자 : 박소지 | 사업구분  | 임기 내     | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 8. ~ 2026. 6.                   | 소요예산  | 1,700백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 정상추진                                  | 이 행 률 | 25%      |     |    |

## 1 공약 최종목표

- 진안의 대표적 상업지구에서 각종 공연과 문화행사 개최
  - 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립 및 운영
  - 진안 문화예술의 거리 조성사업 착공

## 2 사업개요

## □ 진안 문화예술거리 운영

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안읍 일원
- 내 용 : 차 없는 거리에서 문화예술 공연 및 전시 개최
  - 관내 유관기관·단체 및 군 관련 부서 의견수렴
  - 타 지역 문화예술거리 벤치마킹
  - 문화예술거리 운영 협의(일정, 장소, 프로그램 구성 등)
  - 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립
  - 진안읍 상업지역 내 차 없는 거리 문화예술 공연 및 전시 개최
  - 문화예술단체의 각종 공연 및 전시 유도를 통해 다양하고 이색적인 볼거리, 즐길거리 발굴



## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업               | 구분 | 계     | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년   | 임기후 |
|--------------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 계                  |    | 1,700 | 0   | 50  | 50  | 100 | 1,500 |     |
| 명품문화<br>예술거리<br>운영 | 국비 |       |     |     |     |     |       |     |
|                    | 도비 |       |     |     |     |     |       |     |
|                    | 군비 | 1,700 | 0   | 50  | 50  | 100 | 1,500 |     |
|                    | 기타 |       |     |     |     |     |       |     |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

| 구 분  |     | 추진계획  | 목표(%) |
|------|-----|---|-------|
| 2022 | 하반기 | · 진안 문화예술거리 시범 운영계획 수립<br>· 관련 부서 및 단체(상인회, 예술단체) 의견 수렴<br>· 타 지역 문화예술거리 벤치마킹 | 10    |
| 2023 | 상반기 | · 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립(1차년)<br>· 진안 문화예술거리 운영(상반기)                            | 20    |
|      | 하반기 | · 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립<br>· 진안 문화예술거리 운영(하반기)<br>· 진안 문화예술거리 연간 운영평가 및 환류     | 40    |
| 2024 | 상반기 | · 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립(2차년)<br>· 진안 문화예술거리 운영(상반기)                            | 50    |
|      | 하반기 | · 진안 문화예술거리 연간 운영계획 수립<br>· 진안 문화예술거리 운영(하반기)<br>· 진안 문화예술거리 연간 운영평가 및 환류     | 70    |
| 2025 | 상반기 | · 기본 및 실시설계용역 시행  | 80    |
|      | 하반기 | · 기본 및 실시설계용역 완료  | 90    |
| 2026 | 상반기 | · 진안 문화예술의 거리 조성사업 착공   | 100   |
|      | 하반기 | · 진안 문화예술의 거리 조성사업 준공   |       |
| 임기후  |     | · 진안 문화예술거리 운영 활성화  |       |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적  | 달성률(%) |
|------|-----|---|--------|
| 2022 | 하반기 | · 2023년 문화예술거리 운영을 위한 본예산 확보 : 50백만원<br>· 진안문화예술거리 운영계획 수립 : 2022. 12.                            | 5      |
| 2023 | 상반기 | · 문화예술거리 운영 대행용역 계약 : 2023. 4.<br>· 문화예술거리 조성 연구용역 추진계획 수립 : 2023. 4.<br>- 연구용역 발주 : 2023. 4. 19. | 25     |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업        | 구분 | 계  | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 문화예술의 거리 운영 | 계  | 69 | -   | 69  |     |     |     |
|             | 국비 | -  | -   |     |     |     |     |
|             | 도비 | -  | -   |     |     |     |     |
|             | 군비 | 69 | -   | 69  |     |     |     |
|             | 기타 | -  | -   |     |     |     |     |

## 7

## 향후 추진계획

- 문화예술거리 조성 연구용역 추진 : 2023. 4. ~ 9.
  - 문화예술거리 기본방향, 사업여건 분석, 문화아이템 · 세부 추진과제 제시 등
- 문화예술거리 행사 : 2023. 5. ~ 11.(기간중 6회)
  - 공연, 연주, 댄스, 마술 등 다양한 공연 업체 섭외 및 무대 전시 구성 등
  - 관내 예술활동 단체 포함하여 버스킹 무대 구성

## 진안문화예술회관 건립

|                      |                                       |       |           |     |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-----------|-----|----|
| 주관부서(팀)<br>(팀장, 담당자) | 문화체육과(문화예술)<br>팀 장 : 유명자<br>담당자 : 유명자 | 사업구분  | 임기후       | 유 형 | 신규 |
| 사업기간                 | 2022. 8. ~ 2026. 6.                   | 소요예산  | 32,000백만원 |     |    |
| 이행현황                 | 일부추진                                  | 이 행 률 | 15%       |     |    |

## 1 공약 최종목표

- 군민의 문화예술 향유여건 개선을 위한 전문공연장 건립
- 최종목표 : 진안문화예술회관 건립 착공

## 2 사업개요

## □ 진안문화예술회관 건립

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안읍 군상리 481번지 일원
- 내 용 : 전문적인 시설 및 장비를 갖춘 공연장 건립
  - 타 자치단체 및 기관의 전문공연장 벤치마킹
  - 진안에 알맞은 전문공연장 규모 검토
  - 문화예술회관 건립 기본구상 수립
  - 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토
  - 공유재산심의, 건축기획, 공공건축 심의 등 행정절차 이행
  - 기본 및 실시설계 용역 및 착공

## 3

## 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

| 세부사업         | 구분 | 계      | 22년 | 23년 | 24년 | 25년   | 26년    | 임기후    |
|--------------|----|--------|-----|-----|-----|-------|--------|--------|
| 진안예술회관<br>건립 | 계  | 32,000 |     |     |     | 1,380 | 13,880 | 16,620 |
|              | 국비 |        |     |     |     |       |        |        |
|              | 도비 | 2,000  |     |     |     | 500   | 1,500  |        |
|              | 군비 | 30,000 |     | 120 |     | 880   | 12,380 | 16,620 |
|              | 기타 |        |     |     |     |       |        |        |

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

| 구 분  |            | 추진계획   | 목표(%) |
|------|------------|--|-------|
| 2022 | 하반기        | · 타 지역의 전문공연장 벤치마킹<br>· 전문공연장 규모 검토<br>· 진안군 중기지방재정계획 반영                       | 10    |
| 2023 | 상반기        | · 타 지역의 전문공연장 벤치마킹<br>· 문화예술회관 건립 기본 구상 수립                                     | 20    |
|      | 하반기        | · 건축기획 및 공공건축 심의<br>· 지방재정영향평가 및 지방재정투자심사(중앙) 이행<br>· 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 착수 | 40    |
| 2024 | 상반기        | · 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 추진   | 45    |
|      | 하반기        | · 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 완료<br>· 진안군 공유재산관리계획 수립<br>· 도비(균특이양) 신청(20억)          | 70    |
| 2025 | 상반기<br>하반기 | · 기본 및 실시설계용역 시행   | 90    |
| 2026 | 상반기        | · 기본 및 실시설계용역 완료<br>· 진안문화예술회관 건립 착공   | 100   |
|      | 하반기        | · 진안문화예술회관 건립 추진   |       |
| 임기후  |            | · 진안문화예술회관 건립 추진   |       |

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

| 구 분  |     | 추진실적   | 달성률(%) |
|------|-----|--|--------|
| 2022 | 하반기 | · 전문공연장 규모 검토 : 평생학습관과 병행하여 전문공연장 건립<br>· 진안군 중기지방재정계획 반영 : 2022. 11.  | 5      |
| 2023 | 상반기 | · 진안 문화예술회관 건립 타당성 연구용역 시행 : '23.1.31.~5.7.<br>- 19,800천원 / (사)전북경제연구원 | 15     |

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

| 세부사업            | 구분 | 계  | 22년 | 23년 | 24년 | 25년 | 26년 |
|-----------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 진안문화예술<br>회관 건립 | 계  | 22 | -   | 22  |     |     |     |
|                 | 국비 | -  | -   |     |     |     |     |
|                 | 도비 | -  | -   |     |     |     |     |
|                 | 군비 | 22 | -   | 22  |     |     |     |
|                 | 기타 | -  | -   |     |     |     |     |

## 7

## 문제점 및 대책

- 진안예술회관과 평생학습관 연계하여 복합문화공간 건립 의견
  - 2023년 상반기 타당성 연구용역을 통하여 복합예술회관 건립 추진 방향 검토

## 8

## 향후 추진계획

- 군 계획시설 결정 및 재해영향성 검토 : 2023. 5. ~ 2024. 4.
- 지방재정 투자심사 도(중앙) : 2023. 8. ~ 2023. 12.
- 진안문화예술회관 건축기획 : 2024. 2. ~ 2024. 6.
- 진안군 공유재산관리계획 수립 : 2024. 7. ~ 2024. 12.
- 기본 및 실시설계 : 2025. 1. ~ 2024. 12.
- 공사 추진 및 건립 : 2026. ~ 2027.

## 9

## 관련사진





새로운 시작으로 성공시대를 열어가는 미래진안  
[www.jinan.go.kr](http://www.jinan.go.kr)

# 심의 의결서

## 「민선8기」 군민배심원단 문화관광 분과회의 심의의결서

□ 일 시 : 2023. 05. 31.(수)

□ 장 소 : 진안군청 상황실(2층)

| 연번 | 구분  | 성명  | 서명   | 비고 |
|----|-----|-----|--|----|
| 1  | 분과장 | 정병귀 |   |    |
| 2  | 간 사 | 유지화 |  |    |
| 3  | 위 원 | 김석종 |  |    |
| 4  | 위 원 | 김철영 |  |    |
| 5  | 위 원 | 조미숙 |  |    |
| 6  | 위 원 | 최은경 |  |    |
