

소태정 터널 조기 착공

주관부서 (담당자, 전화)	건설교통과 (김준형, 430-2362)	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2021. 1. ~ 2025. 12.	소요예산	68,500백만원		
이행현황	일부추진	이 행 률	20%		

1 공약 최종목표

- 소태정 터널의 조기 착공을 통한 국도 26호선 이용객 안전 도모
 - 진안군에서 완주군을 잇는 국도 26호선(군산~대구) 중 진안군 부귀면 ~ 완주군 소양면 구간의 선형불량구간을 개선하여
 - 국도 간선기능을 확보하고 도로이용객들의 안전 도모

2 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.(5년)
- 장 소 : 진안군 부귀면 봉암리 ~ 완주군 소양면 신원리 일원
- 내 용
 - 선형 개량 사업 L = 3.0km(상행선 2차로)
 - 교량 : 270m/2개소, 터널 : 1,100m/ 1개소

3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'20	'21	'22.6.	임기후
계		68,500			3,500	65,000
소태정 도로 선형 개량사업	국비	68,500			3,500	65,000
	도비					
	군비					
	기타					

4

연도별 추진계획 및 목표

□ 소태정 도로 선형 개량사업

구 분	추진계획	목표(%)
2020	하반기 · 기획재정부 일괄 예비타당성 조사 용역	10
2021	상반기 · 제5차 국도 · 국지도 5개년 계획 대상사업 일괄예타 심의	20
	하반기 · 재정사업 심의 및 제5차 국도 · 국지도 계획 확정	30
2022	상반기 · 실시설계(보완) 및 보상 협의(공사 착공)	40
	하반기 · 토지 보상 협의 및 사업 추진(공사 착공)	50
임기후		100

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분	추진실적	달성률(%)
2020	하반기 · 예비 타당성 조사 용역 추진 : 2020. 04. ~	10
2021	1분기 · 관련 기관 방문(기재부, 국토부) : 2021. 02. 15. · 국회 방문 : 2021. 03. 26. · 전북 동부권 4개 지역 지자체장 연대서명 : 2021. 03. 30.	10
	2분기 · 국회 방문(기획재정부위원회) : 2021. 04. 20. · 관련 기관 방문(기재부, 국토부) : 2021. 05. 12. · 관련 기관 방문(기재부, 국토부) : 2021. 06. 14. ~ 15. · 재정사업심의 대비 정책성평가 자료(보완) : 2021. 06. 18. · 관련 기관 방문(국토부) : 2021. 06. 21. · 관련 기관 방문(익산청) : 2021. 06. 22.	10
	3분기 · 관련 기관 방문(익산청) : 2021. 07. 08. · 제5차 국도 정책성 평가 발표 및 심의 참석 : 2021. 07. 15. · 관련 기관 방문(기재부, 국토부) : 2021. 07. 16. · 관련 기관 방문(국토부) : 2021. 08. 18. · 제5차 국도 국지도 5개년 계획 일괄예타 평가 발표 : 2021. 08. 24. ※ 미선정	20
	4분기 · 제6차 국도 국지도 5개년 계획 재반영 건의 : 2021. 09. 10. · 국도 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 대상사업 제출 : 2021. 10. 07.	20

※ 당초 일괄예비타당성조사 일정이 20년 12월까지였으나, 코로나 19 인하여 정책성평가 늦어짐에 따라 21년 6월로 연장되었음

6

연도별 예산 확보(집행)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	‘20	‘21	‘22.6.
계		해당없음			
소태정 도로 선형 개량사업	국비				
	도비				
	군비				
	기타				


7

향후 추진계획

- 도로분야 국가계획 수립 대응 연구용역(전라북도) : 2021. 12.
- ※ 보령재 반영을 위한 다각적인 대응논리 발굴
- 제6차 국토·국지도 5개년 계획(2026 ~ 2030) 재반영 지속 건의(익산청)

8

관련사진

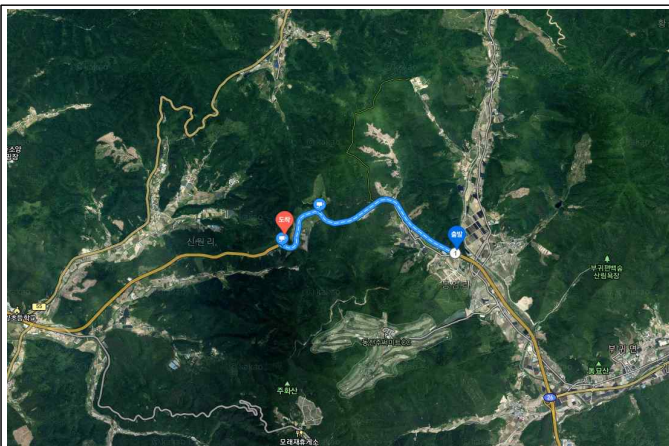

위 치 도(부귀면 봉암리 일원)



평 면 도



예타 현장 설명 사진(2020. 5. 14.)



현황 사진

