

## 우화산 생활체육공원 조성

주관부서 (담당자, 전화)	문화체육과 (이화정, 430-2376)	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2020. ~ 2022.	소요예산	1,800백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	30%		

### 1 공약 최종목표

- 도시숲을 연계한 체육생태공원 확충으로 군민의 건강증진과 만남의 장소 제공

### 2 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2022.
- 장 소 : 진안읍 군하리 64-1번지 우화산 일원
- 내 용 : 우화정 정비 1식, 체육광장 조성 1식, 산책로 조성 0.8km 등

### 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	‘20	‘21	‘22.6.	임기후
계		1,800		1,800		
우화산 생활체육공원 조성	국비	540		540		
	도비					
	군비	1,260		1,260		
	기타					

## 4

## 연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2020	하반기	· 체육진흥시설 지원사업(군특) 공모선정	10
2021	상반기	· 군계획시설(월랑공원 : 체육공원) 조성계획변경 및 실시설계 용역 동시추진	20
	하반기	· 군계획시설(월랑공원 : 체육공원) 조성계획변경 변경 완료	30
2022	상반기	· 공사 착공( 3월 중)	35
	하반기	· 공사 준공(10월 중)	100
임기후			

## 5

## 연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2020	하반기	· 체육진흥시설 지원사업(군특) 공모선정 · 군계획시설(월랑공원 : 체육공원) 조성계획변경 및 실시설계 용역 발주	10
2021	1분기	· 군계획시설 조성계획변경 및 실시설계용역 추진	15
2021	2분기	· 지질조사 및 군관리계획(산책로 7개소, 반다비체육센터예정부지) 반영 추진	20
2021	3분기	· 진안 군관리계획결정(변경) 신청(' 21.8.17.) · 전라북도 원가심사 의뢰(' 21.9.27.) · 진안군 일상감사 완료(' 21.10.5.)	30
2021	4분기	· 전라북도 원가심사 완료(' 21.10.20.) · 실시계획인가 관련부서 사전협의(' 21.11.17.~12.6) · 진안 군계획시설사업 실시계획인가 신청(' 21.12.9.)	30

## 6

## 연도별 예산 확보(집행)액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	'20	'21	'22.6.
계		1,890	90	1,800	
우화산 생활체육공원 조성	국비	540		540	
	도비				
	군비	1,350	90	1,260	
	기타				


## 7

### 향후 추진계획

- 진안 군계획시설사업 실시계획인가 : 2021. 1.
- 공사 착공 및 완료 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

## 8

### 관련자료

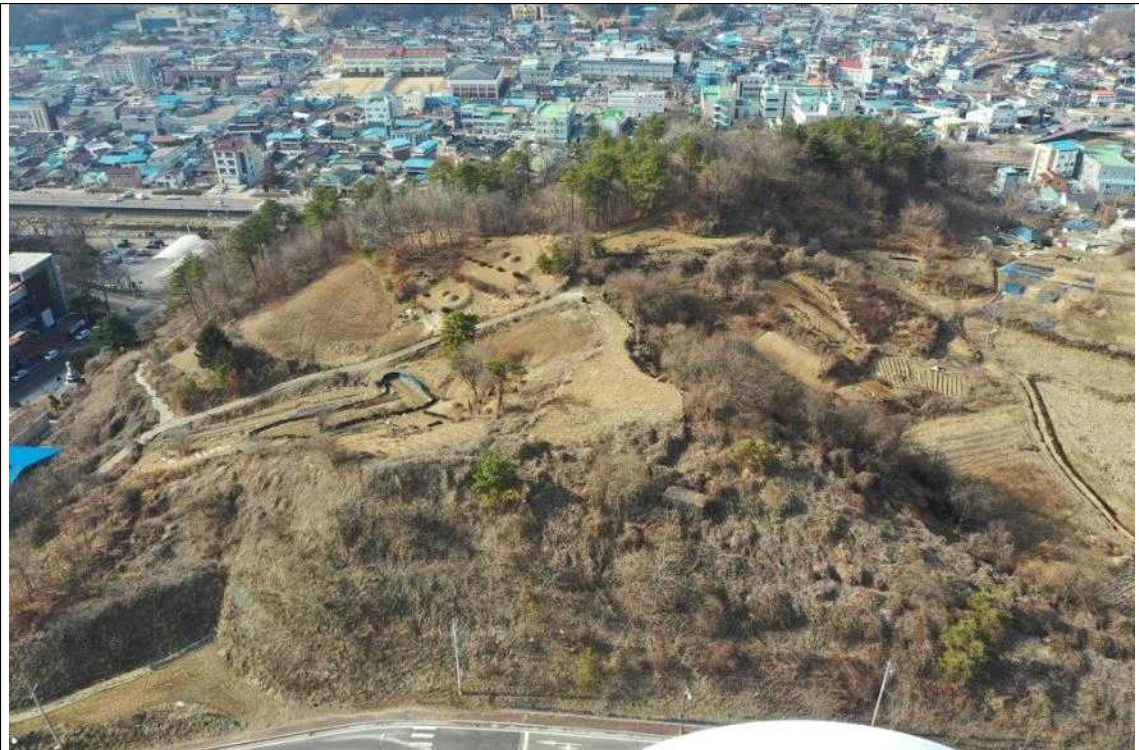

우화산 전경 : 진안읍 군하리 64-1번지 일원
