

진안군의료원 운영

현 황

가. 진안군의료원 건립

- 기 간 : 2010. ~ 2014.(5년)
- 총사업비 : 0백만원(국비0 도비0 군비0)
- 위 치 : 진안군 진안읍 군상리 90-184외 26필지
- 규 모 : 부지 21,158㎡, 건물 5,330㎡(80병상), 장례식장
6개과(내과,일반외과,정형외과,응급의학과,재활의학과,산부인과)


나. 주요사업

- 지역주민의 진료사업
- 감염병 및 주요 질병의 관리 및 예방 사업
- 민간 의료기관이 담당하기 곤란한 보건의료사업
- 의료인·의료기사 및 지역주민의 보건교육사업
- 의료지식과 치료기술의 보급 등에 관한 사항
- 국가 또는 지방자치단체의 공공보건의료 시책의 수행
- 그 밖에 보건복지부장관 및 지방자치단체의 장이 필요하다고 인정
한 보건의료사업의 수행 및 관리

다. 조직 및 인력 계획

■ 조 직

- 의료원 구조 : 이사장은 원장을 겸하고 원장 아래 진료부와 관리부를 둠
- 법률에 의해 임원 (이사장 1인, 6인 이상 8인 이하의 이사, 감사 1인)을 두며 이사장은 상근이며, 원장을 겸임함

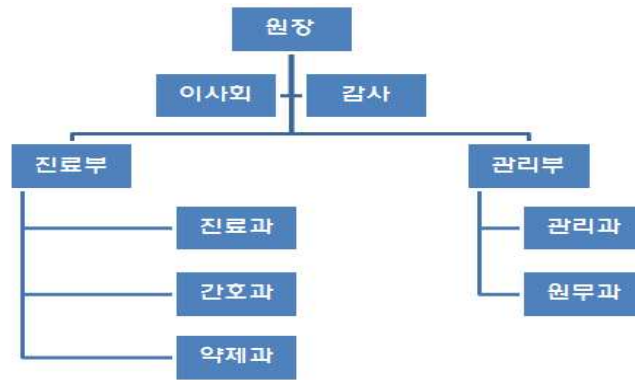

■ 인 력 : 73명

| 직 종(명) | | | 인 원 수(명) |
|------------------------|-------|----|----------|
| 의사직 | | | 10 |
| 간호직 | 간호사 | 28 | 32 |
| | 간호조무사 | 4 | |
| 약부직 | 약사 | 1 | 2 |
| | 조제보조 | 1 | |
| 의료기사직 | 방사선사 | 2 | 9 |
| | 임상병리사 | 2 | |
| | 물리치료사 | 2 | |
| | 의무기록사 | 1 | |
| | 응급구조사 | 2 | |
| 영양직 | 영양사 | 1 | 3 |
| | 조리원 | 2 | |
| 행정직(사무직, 사회복지사, 기술직 등) | | | 13 |
| 기타고용직 | | | 4 |
| 계 | | | 73 |

■ 직원채용 : 진안군의료원 의료법인 설립 정관에 조직, 인력 등 인사규정, 보수규정을 적용 진안군의료법인에서 인력 채용

II 부대시설 확충계획

가. 장례식장 건립 추진

■ 사업개요

- 위 치 : 진안군 진안읍 군상리 90-184외 26필지
- 사업기간 : 2013 ~ 2014(2개년)
- 사업규모 : 부지 21,158㎡, 건물 1,332.36㎡, 지상3층
- 시설계획 : 입관/안치실(1층), 분향/접객실(2,3층 3실)
- 총사업비 : 3,000백만원(국비 1,500/군비 1,500)

■ 추진상황

- '13. 06. 04. : 국립중앙의료원 기본설계심의 신청
- '13. 09. 25. : 건축(변경)협의 요청
- '13. 10. 21. : 장례식장 기본 및 실시설계 완료
- '13. 10. 21. : 장례식장 원가심사 의뢰(전라북도)

■ 향후계획

- 개발행위변경허가 심의 완료(전라북도) : 2014. 02.
- 진안군의료원 장례식장 증축공사 발주 : 2014. 03.
- 진안군의료원 장례식장 증축공사 준공 : 2014. 12.

나. 의료인숙소 건립

■ 사업개요

- 위 치 : 진안읍 군상리 99-1외 3필지(구 보건소)
- 사업기간 : 2014. ~ 2015.(2개년)
- 사 업 비 : 3,000백만 원(국비1,500, 군비1,500)
- 사업내용(계획)

| 구 분 | 의 료 인 숙 소 | 비 고 |
|-------|---|-------------------|
| 규 모 | 지상 4층 | 도시지역 제1종일반주거지역 |
| 연 면 적 | 1,658㎡ | |
| 주요시설 | 총 25세대 ·80㎡(24평형) : 7세대 ·61㎡(18.4평형) : 18세대 | |

■ 추진일정

- 진안군의료원 의료인숙소 설계용역 : 2014. 1 ~ 2014. 7
- 관련법에 의한 행정절차 이행 : 2014. 2 ~ 2014. 7
- 진안군의료원 의료인숙소 착공 : 2014. 8.
- 진안군의료원 의료인숙소 준공 : 2015. 12.

3 향후 추진계획

■ 진안군의료원 건립

- 원장공모 : 2014. 1.
- 의료원장 임명 : 2013. 2.
- 이사회 구성 및 정관작성 : 2014. 2.
- 법인설립 및 등기 : 2014. 3.
- 직원채용 : 2014. 3. ~ 7.
- 의료장비 구축 : 2014. 3. ~ 7.
- 의료원 개원 : 2014. 7.
