

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	문화체육과(문화예술) 팀 장 : 유명자 담당자 : 유명자	사업구분	임기후	유 형	신규
사업기간	2022. 8. ~ 2026. 6.	소요예산	32,000백만원		
이행현황	일부추진	이 행 륜	20%		

1 공약 최종목표

- 군민의 문화예술 향유여건 개선을 위한 전문공연장 건립
- 최종목표 : 진안문화예술회관 건립 착공

2 사업개요

☐ 진안문화예술회관 건립

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 장 소 : 진안읍 군상리 481번지 일원
- 내 용 : 전문적인 시설 및 장비를 갖춘 공연장 건립
 - 타 자치단체 및 기관의 전문공연장 벤치마킹
 - 진안에 알맞은 전문공연장 규모 검토
 - 문화예술회관 건립 기본구상 수립
 - 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토
 - 공유재산심의, 건축기획, 공공건축 심의 등 행정절차 이행
 - 기본 및 실시설계 용역 및 착공

3

연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
진안예술회관 건립	계	32,000				1,380	13,880	16,620
	국비							
	도비	2,000				500	1,500	
	군비	30,000		120		880	12,380	16,620
	기타							

4

연도별 추진계획 및 목표

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 타 지역의 전문공연장 벤치마킹 · 전문공연장 규모 검토 · 진안군 중기지방재정계획 반영	10
2023	상반기	· 타 지역의 전문공연장 벤치마킹 · 문화예술회관 건립 기본 구상 수립	20
	하반기	· 건축기획 및 공공건축 심의 · 지방재정영향평가 및 지방재정투자심사(중앙) 이행 · 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 착수	40
2024	상반기	· 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 추진	45
	하반기	· 군 계획시설 결정 및 재해 영향성 검토 완료 · 진안군 공유재산관리계획 수립 · 도비(균특이양) 신청(20억)	70
2025	상반기	· 기본 및 실시설계용역 시행	90
	하반기		
2026	상반기	· 기본 및 실시설계용역 완료 · 진안문화예술회관 건립 착공	100
	하반기	· 진안문화예술회관 건립 추진	
임기후		· 진안문화예술회관 건립 추진	

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 전문공연장 규모 검토 : 평생학습관과 병행하여 전문공연장 건립 · 진안군 중기지방재정계획 반영 : 2022. 11.	5
2023	상·하반기	· 진안 문화예술회관 건립 타당성 연구용역 시행 : '23.1.31.~10.22. - 19,800천원 / (사)전북경제연구원 · 관계부서관 현안회의 토론 : 3회(8.11., 9.14., 10.6.) · 전문공연장 규모 재검토 : 400석규모의 공연장, 전시공간, 예술인 사무공간	20

6

연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
진안문화예술회관 건립	계	20	-	20			
	국비	-	-				
	도비	-	-				
	군비	20	-	20			
	기타	-	-				

7

문제점 및 대책

- 학천지구내 타 사업과의 중복 진안예술회관과 평생학습관 연계하여 복합문화공간 건립 의견이 있었으나
 - 관계부서관 현안회의(3회)를 통해 부지내 각 건물에 대한 유사·중복되는 공간구성을 최소화하는 방안으로 도출되어 단독 건물 추진


8

향후 추진계획

- '23. ~ '27년 중기지방재정계획 사업계획 변경 : 2023. 10. ~ 2023. 12.
- 지방재정 투자 심사 (도) : 2023. 11. ~ 2024. 3.
- 진안군 공유재산관리계획 수립 : 2024. 2. ~ 2024. 5.
- 군관리계획 용도변경(1종일반주거 ⇒ 2종일반주거) : 2024. 6. ~ 2024. 10.
- 건축기획 용역 : 2024. 6. ~ 2024. 10.
- 기본 및 실시설계 : 2024. 11. ~ 2025. 3.
- 공사 착공 및 준공 : 2025. 4. ~ 2027.



현장 항공사진

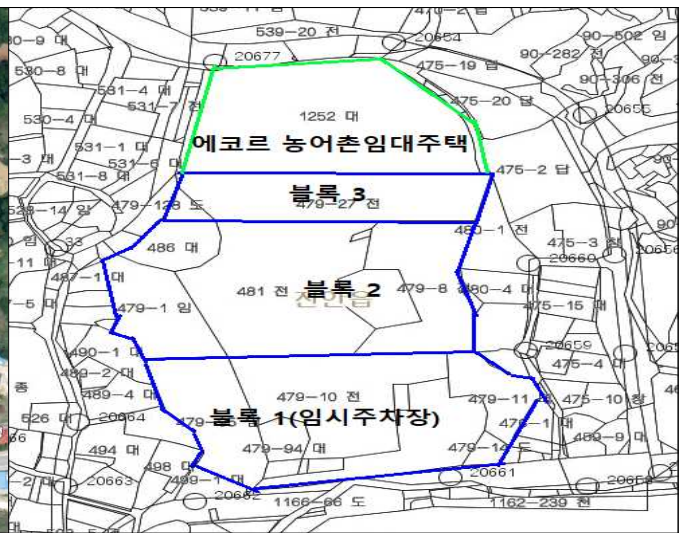

지 적 도
