

## 지덕권 친환경 산림고원 조성사업

주관부서(팀) (팀장, 담당자)	산림과(산림치유) 팀 장 : 안시관 담당자 : 유다빈	사업구분	임기 후	유 형	신규
사업기간	2023. ~ 2033.	소요예산	262,700백만원		
이행현황	정상추진	이 행 률	20%		

## 1 공약 최종목표

## ○ 예비타당성 대상 사업 통과 및 국가사업 추진 선정

## 2 사업개요

- ☐ 사업위치 : 진안군 백운면 노촌리, 장수군 천천면 비룡리 일원(500ha)
- ☐ 사업기간 : 2023. ~ 2033.(11개년)
- ☐ 사 업 비 : 2,627억원(국비)
- ☐ 사업내용 : 세계 산림(약용) 식물 활용 단지 조성
  - 세계 산림약용식물 테스트베드(실내 대형온실, 야외 테스트베드)
  - 산림교육·체험 융복합(산림유학원, 산림교육체험센터)
  - 고원생태 체험·관광(글로벌 허브 테마파크, 신광재 고원체험공간)
  - 축제·전시·브랜딩(축제 액티비티 공간, 전시, 관람, 홍보 공간)

⇒ **중점** 국립지덕권산림치유원은 힐링, 휴양 / 신광재는 체험관광, 소득창출

## 3 연도별 투자계획

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년	임기후
계		262,700	0	0	500	4,399	14,880	242,921
세계산림	국비	262,700	0	0	500	4,399	14,880	242,921
식물	도비	0	0	0	0	0	0	0
융복합단지	군비	0	0	0	0	0	0	0
조성	기타	0	0	0	0	0	0	0

4

연도별 추진계획 및 목표

지덕권 친환경 산림고원 조성사업

구 분		추진계획	목표(%)
2022	하반기	· 기본계획 수립 연구용역	20
2023	상반기	· 기본계획 수립 연구용역	20
	하반기	· 국가 정책사업 선정을 위한 부처(기재부, 산림청) 설명	20
2024	상반기	· 산림청 자체 기본구상 및 타당성 조사 용역	30
	하반기	· 산림청 기본구상 및 타당성 조사 용역 · 예비타당성 대상사업 제출(산림청→기재부)	50
2025	상반기	· 기재부 예비타당성 대상사업 선정(재정사업 평가위원회) · 기재부 예비타당성 조사(KDI)	70
	하반기	· 기재부 예비타당성 조사(KDI)	70
2026	상반기	· 예비타당성 통과, 사업예산 반영 및 기본설계	100
	하반기	· 사업예산 반영 및 기본설계	100
임기 후		· 사업 착공, 조성(2028~2033)	100

5

연도별 추진실적 및 달성률

구 분		추진실적	달성률(%)
2022	하반기	· 기본계획 수립용역(`22.4.~`23.4., 전라북도 시행, 국토연구원) - 중간보고회(`22.10.) · 안호영 국회의원, 산림청장 현장 방문 (`22.12.2.)	20
2023	상반기	· 기본계획 수립 중간보고(`23.2.3.) · 정부 중기사업계획 제출(산림청→기재부) · 도지사 연초방문 주요현안 논의(`23.2.7.) · 기재부, 산림청 국가예산 확보 건의(도, 군) · 국회의원 지역현안 협의(`23.3.24, 안호영의원-부군수) · 관계기관 실무협의(`23.4.6. 산림청, 도, 군, 국토연구원) · 기본계획 수립 최종보고(`23.4.20., 전라북도) - 174백만원(도비), `22.4.21.~`23.4.20, 국토연구원 수행	20
	하반기	· 「지덕권 약용식물산업화 연구」 국비 4억원 확보(`23.8.) - 기획재정부 2024년 정부 예산안 심사에서 산림청 용역비 반영	20

## 6

## 연도별 예산 확보액

(단위: 백만원)

세부사업	구분	계	22년	23년	24년	25년	26년
계		400	0	0	400	0	0
- 세계 산림(약용)식물 융복합단지 조성	국비	400	0	0	400	0	0
	도비	0	0	0	0	0	0
	군비	0	0	0	0	0	0
	기타	0	0	0	0	0	0

## 7

## 향후 추진계획


- 2024년 정부예산(안) 국회 심의단계 통과를 위해 지속적인 현안관리
- (산림청) 「지덕권 약용식물산업화 연구」 사전 타당성 용역 : 2024.
- 용역 결과에 따라 예비타당성 신청(산림청→기재부) : 2025.
- 예비타당성 통과 후 기본설계 및 본사업 추진 : 2026. 이후

## 8

## 관련사진



산림청장, 안호영의원 현장방문(22.12.2.)

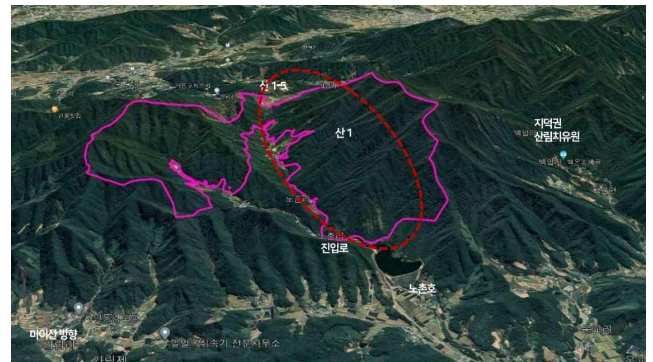

도유림 현황 및 입지



기본구상 연계도



컨셉(Global Herbtopia)
