



= 민선7기 군민과의 약속 =

공약이행평가 군민배심원단 평가자료

[2021.12.31.기준, **명품관광분과**]





목 차



| | |
|---|--------------|
| I . 2020년 공약이행평가 결과 | 1 |
| 1. 평가개요 | 1 |
| 2. 평가결과 | 1 |
| 3. 세부평가결과 | 2 |
| II . 2021년 공약사업 추진 총괄현황 | 4 |
| 1. 총괄 | 4 |
| 2. 분야별 추진현황 | 4 |
| 3. 실국소별 추진현황 | 4 |
| 4. 부서별 추진현황 | 5 |
| III . 2021년 명품관광분과 공약사업 평가 | 6 |
| 1. 자체평가기준 | 6 |
| 2. 평가방법 | 7 |
| 3. 공약조정심의 | 7 |
| 4. 명품관광분과 공약평가 목록 | 7 |
| 5. (4-1) 치유힐링 일번지 진안 | 8 |
| 6. (4-2) 우화산 생활체육공원 조성 | 28 |
| 7. (4-3) 진안고원 웰빙산골음식 세계화기반 구축 | 30 |

I . 2020년 공약이행평가 결과

□ 평가개요

- 평가기간 : 2021. 2. 15 ~ 3. 3.(17일간)
- 평가대상 : 5대분야 33개 공약, 공약변경조정안 5건
- 평 가 자 : 전체 배심원 33명 중 25명
(지역경제 5 , 맞춤형지 4, 인재육성 5, 명품관광 5, 소통행정 6)
- 평가방법 : 분과별 공약사업에 대해 공약실천계획서 대비 이행정도, 사업비 확보현황 등 이행현황을 제출된 자체평가자료에 기초하여 담당공무원 설명 및 질의응답을 통해 평가
※ 현장 확인 평가 : 없음
- 소관 분과별 평가 결과 및 의견을 수렴한 평가보고서 작성 후 공약이행평가군민배심원단 전체회의에 제출하여 심의의결한 결과를 권고안 형태로 작성하여 군에 제출

□ 평가결과

(2020.12.31. 현재)

| 구 분 | 계 | 추진현황 | | | 비고 |
|---------|----|------|------|----|----|
| | | 완 료 | 정상추진 | 미진 | |
| 심 의 안 | 33 | 8 | 16 | 9 | |
| 평 가 결 과 | 33 | 8 | 15 | 10 | |

※ 소통행정분과 소관 공약 5-2 적극적인 민원행정서비스 도입은 주관부서(민원봉사과)에서 이행을 50%, 정상추진으로 자체평가 하였으나 심사결과 시스템 미구축, 예산집행 부족 등 공약실천계획 목표 대비 미진으로 평가

□ 세부평가결과

*이행현황 및 이행률 누적작성

1. 지역경제분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|--------------------------|----------|------|------|
| 1-1 | 지역별 특화산업 발굴 육성 | 정상추진 | 20% | 40% |
| 1-2 | 진안형 농축임산물 통합브랜드 판매시스템 구축 | 미진 | 40% | 13% |
| 1-3 | 농민수당 지원 확대 | 정상추진 | 20% | 20% |
| 1-4 | 도시가스 미공급 지역주민 연료비 지원 | 미진 | 80% | 25% |
| 1-5 | 소태정 터널 조기 착공 | 미진 | 10% | 5% |
| 1-6 | 진안군 재난기본소득지원금 지급 | 완료 | 100% | 100% |
| 1-7 | 반려동물 케어 | 정상추진 | 25% | 25% |
| 1-8 | 전통시장 공공요금 지원 | 완료 | 100% | 100% |
| 1-9 | 전통시장 임대료 지원 | 정상추진 | 50% | 50% |
| 1-10 | 시장 상가내 공공 와이파이 설치 지원 | 완료 | 100% | 100% |
| 계약변경 | 진안형 농축임산물 통합브랜드 판매시스템 구축 | 승인 | | |

2. 맞춤형복지분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|-------------------------|-------------|------|------|
| 2-1 | 수변구역 주민지원사업(직접지원) 확대 추진 | 미진 | 50% | 25% |
| 2-2 | 치매안심 돌봄시스템 구축 | 정상추진 | 80% | 90% |
| 2-3 | 여성 토론회 운영 | 정상추진 | 25% | 25% |
| 2-4 | 어르신일자리지원센터 신축 | 미진 | 50% | 20% |
| 2-5 | 다문화 가정 정책지원 | 정상추진 | 80% | 80% |
| 2-6 | 장애물 없는 생활환경 만들기 | 이행후 계속추진 | 100% | 100% |
| 2-7 | 진안군 반다비 체육센터 건립 | 정상추진 | 5% | 5% |
| 2-8 | 건강검진비 지원 | 미진 | 10% | 10% |

3. 인재육성분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|-------------------------------|-------------|------|------|
| 3-1 | 진안 지혜의 숲 도서관으로 Dream 진안 기반 마련 | 미진 | 55% | 10% |
| 3-2 | 청년 미래지원센터 신설 | 정상추진 | 50% | 50% |
| 3-3 | 진안사람 천년배움 지원 | 정상추진 | 70% | 70% |
| 3-4 | 신성장동력 드론산업기반 구축 | 미진 | 70% | 40% |
| 3-5 | 자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현 | 정상추진 | 20% | 50% |
| 3-6 | 차별 없는 이동권 보장 | 이행후 계속추진 | 100% | 100% |
| 3-7 | 청년 주거비용 지급 | 정상추진 | 50% | 50% |
| 공약변경 | 청년 미래지원센터 신설 | 승인 | | |
| 공약변경 | 진안사람 천년배움 지원 | 승인 | | |
| 공약변경 | 자율과 전문성이 함께하는 미래교육 구현 | 승인 | | |

4. 명품관광분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|----------------------|----------|-----|-----|
| 4-1 | 치유·힐링 일번지 진안 | 정상추진 | 5% | 5% |
| 4-2 | 우화산 생태공원 조성 | 정상추진 | 10% | 10% |
| 4-3 | 진안고원 웰빙산골음식 세계화기반 구축 | 정상추진 | 20% | 20% |
| 공약변경 | 치유·힐링 일번지 진안 | 승인 | | |

5. 소통행정분과

| 관리번호 | 공 약 명 | 평가 결과 | 목표 | 이행률 |
|------|-------------------|-------------|-----|------|
| 5-1 | 농림축산분야 국 신설 | 완료 | 100 | 100% |
| 5-2 | 적극적인 민원행정서비스 도입 | 미진 | 50 | 25% |
| 5-3 | 생활공공서비스 통합지원센터 운영 | 이행후 계속추진 | 100 | 100% |
| 5-4 | 열린진안정책위원회 운영 | 미진 | 80 | 40% |
| 5-5 | 적극행정에 따른 공무원 처우개선 | 이행후 계속추진 | 100 | 100% |

Ⅱ. 2021년 공약사업 추진 총괄현황

☐ 총 괄 : 5개분야, 33개 사업

(2021.12.31. 현재)

| 구 분 | 계 | 추진현황 | | | 비고 |
|-------------|-----|------|------|------|----|
| | | 완 료 | 정상추진 | 일부추진 | |
| 공 약 수 (개) | 33 | 19 | 12 | 2 | |
| 구 성 비 (%) | 100 | 57.6 | 36.3 | 6.1 | |

☐ 분야별 추진현황

| 분 야 | 총건수 | 추진현황 | | | 비고 |
|------------|-----|------|------|------|----|
| | | 완 료 | 정상추진 | 일부추진 | |
| 계 | 33 | 19 | 12 | 2 | |
| 풍요로운 지역경제 | 10 | 6 | 3 | 1 | |
| 차별없는 맞춤형복지 | 8 | 3 | 5 | | |
| 미래희망 인재육성 | 7 | 5 | 1 | 1 | |
| 치유힐링 명품관광 | 3 | | 3 | | |
| 공감하는 소통행정 | 5 | 5 | | | |

※ 평가기준: 한국매니페스토실천본부 공약이행 평가기준 적용

☐ 실국소별 추진현황

| 실국소 | 총건수 | 추진현황 | | | 비고 |
|--------|-----|------|------|------|----|
| | | 완 료 | 정상추진 | 일부추진 | |
| 계 | 33 | 19 | 12 | 2 | |
| 기획홍보실 | 2 | 1 | | 1 | |
| 행정복지국 | 13 | 9 | 4 | | |
| 농촌경제국 | 10 | 6 | 4 | | |
| 안전환경국 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 보 건 소 | 2 | 1 | 1 | | |
| 농업기술센터 | 1 | | 1 | | |

□ 부서별 추진현황

| 부 서 명 | | 총건수 | 추진현황 | | | 비고 |
|--------|--------|-----|------|------|------|----|
| | | | 완 료 | 정상추진 | 일부추진 | |
| 계 | | 33 | 19 | 12 | 2 | |
| 기획홍보실 | | 2 | 1 | | 1 | |
| 행정복지국 | 행정지원과 | 5 | 5 | | | |
| | 사회복지과 | 1 | 1 | | | |
| | 여성가족과 | 3 | 1 | 2 | | |
| | 민원봉사과 | 1 | 1 | | | |
| | 문화체육과 | 3 | 1 | 2 | | |
| 농촌경제국 | 농업정책과 | 2 | | 2 | | |
| | 농축산유통과 | 2 | 1 | 1 | | |
| | 농촌활력과 | 6 | 5 | 1 | | |
| 안전환경국 | 안전재난과 | 1 | 1 | | | |
| | 건설교통과 | 2 | 1 | | 1 | |
| | 관광과 | 1 | | 1 | | |
| | 환경과 | 1 | | 1 | | |
| 보건소 | | 2 | 1 | 1 | | |
| 농업기술센터 | 농촌지원과 | 1 | | 1 | | |

Ⅲ. 2021년 명품관광분과 공약사업 평가

□ 자체평가기준

| 구 분 | 정량적 기준 | | 정성적 기준 |
|--------------|--|---|---|
| 완 료 | <ul style="list-style-type: none"> 사업완료, 목표달성, 제도도입 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우 | | <ul style="list-style-type: none"> 주민만족도 충족, 사업효과 가시화 등으로 사실상 사업완료로 볼 수 있는 경우 |
| | 이행 후 계속추진 | <ul style="list-style-type: none"> ▶ 공약내용 이행완료 후 추가 목표를 세워 추진 중인 사업 ▶ 공약내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 | |
| 정상추진 | <ul style="list-style-type: none"> 추진일정, 규모, 단계 등 계획한 대로 정상추진 중이고 임기종료 시점까지 이행완료가 예상되는 사업 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경 하였으나 객관·타당한 사유가 있으며 변경된 계획으로 사업이 정상 추진 되는 경우 | | <ul style="list-style-type: none"> 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약 사유가 없고 사실상 사업이 정상적으로 추진되는 경우 단, 국·시비 예산확보 지연, 상급기관 또는 외부기관의 절차이행 지연 등의 사유로 추진일정·규모·단계 등이 변동 되는 경우는 정상추진으로 평가 |
| 일부추진 (부진) | <ul style="list-style-type: none"> 추진하고 있으나, 예상 목표를 달성 하지 못하고 부진한 사업 추진일정, 규모, 단계 등 계획을 변경 하였으나 객관·타당한 사유가 없고 사업이 사실상 정상적으로 추진되지 않는 경우 | | <ul style="list-style-type: none"> 법령 등 제한, 시민단체·주민 반대 등 사업추진 제약사유를 극복하지 못하며 사실상 사업 추진이 부진한 경우 |
| 보 류 | <ul style="list-style-type: none"> 사업추진을 위한 사전 절차이행, 사업내용을 구체화하기 위한 연구·용역 등을 실시하기 위해 일정기간 사업을 보류하는 경우 기타 객관, 타당한 사유가 있어 일정기간 사업을 보류하는 경우 도시계획, 공원계획, 투자심사 등 선행절차가 필요하거나, 사업여건 미충족 등으로 사실상 사업 시기가 도래하지 않은 경우 | | |
| 폐 기 | <ul style="list-style-type: none"> 사실상 사업을 취소하기로 한 경우 주변여건 등의 이유로 부득이하게 사업을 폐기하는 경우 | | |

□ 평가방법

- 2020년 평가결과 완료(이행후 계속 추진 포함)된 사업은 평가에서 제외
- 주관부서별(공약 추진 부서) 자체평가 결과에 대하여 공약 실천계획대비 당해연도 추진실적을 비교 평가

□ 공약조정 심의

- 공약추진 과정에서 정책여건 변화, 행정절차 이행(사회보장제도 신설 등) 과정에서 공약의 변경이 필요한 경우 공약조정 심의
- 공약의 변경·조정 사유의 타당성, 적절성 등을 심의

□ 명품관광분과 공약평가 목록

(평가기준일 : 2021.12.31.)

| 관리번호 | 공 약 명 | 전년도 이행률 (%) | 2021년 이행률 (%) | 비고 |
|------|----------------------|-------------------|---------------------|----|
| 4-1 | 치유·힐링 일번지 진안 | 5 | 50 | |
| 4-2 | 우화산 생태공원 조성 | 10 | 30 | |
| 4-3 | 진안고원 웰빙산골음식 세계화기반 구축 | 20 | 60 | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------|-----------|-----|----|
| 주관부서 (담당자, 전화) | 관광과 (김봉철, 430-2507) | 사업구분 | 임기 후 | 유 형 | 신규 |
| 사업기간 | 2020. 7. ~ 2025. 12. | 소요예산 | 15,931백만원 | | |
| 이행현황 | 정상추진 | 이 행 률 | 50% | | |

1 공약 최종목표

- 진안군 주요 관광자원을 연계한 힐링 관광벨트 조성

2 사업개요

- ☐ **천혜의 자연과 비경을 담은 드라이브 코스 활성화**
 - 사업기간 : 2020. ~ 2022.
 - 사 업 비 : 300백만원
 - 내 용
 - 사진찍기 좋은곳 조성
 - 11개 읍면 차박하기 좋은 곳 발굴
 - 드라이브 코스 편의시설 확충(안내표지판, 가로경관 조성 등)
- ☐ **주요 경관자원을 활용한 힐링 체험벨트 구축**
 - 사업기간 : 2020. ~ 2025.
 - 사 업 비 : 12,484백만원
 - 내 용
 - 용담호변 관광자원화 사업 추진
 - 운일암반일암 관광자원화 사업 추진
 - 마이산 대표관광지 육성사업 추진
 - 마이산 헬스 관광벨트 조성사업 추진
 - 마이산 가족활동 체험장 조성사업 추진
- ☐ **진안고원 힐링 투어 프로그램 개발**
 - 사업기간 : 2020. ~ 2023.
 - 사 업 비 : 1,100백만원
 - 내 용
 - 사계절 가족 힐링캠프 운영
 - 진안·무주 국가지질공원 탐사 프로젝트 계획 수립 및 운영

□ **유휴 관광자원 활성화로 쉬어가는 공간 조성**

- 사업기간 : 2020. ~ 2024.
- 사업비 : 1,882백만원
- 내용
 - 마이산 북부 관광안내체계 구축을 통한 관광활성화
 - 마이산 힐링정원 조성

□ **진안군 관광종합개발계획 수립**

- 사업기간 : 2020. ~ 2021.
- 사업비 : 165백만원
- 내용
 - 5개년 진안군 관광종합개발계획 수립

3

연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

| 세부사업 | 구분 | 계 | | '20 | | '21 | | '22.6. | | 임기후 | |
|-------------------------------------|----|--------|-------|-----|-----|-------|-------|--------|-------|-------|----|
| | | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 |
| | 계 | 15,931 | 8,285 | 815 | 815 | 5,426 | 5,344 | 2,158 | 2,126 | 7,532 | |
| 천혜의 자연과 비경을 담은 드라이브 코스 활성화 | 국비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 도비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 군비 | 300 | 200 | | | 100 | 100 | 200 | 100 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 주요 경관자원을 활용한 힐링 체험벨트 구축 | 국비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 도비 | 8,984 | 4,692 | | | 3,538 | 3,538 | 1,154 | 1,154 | 4,292 | |
| | 군비 | 3,500 | 1,250 | | | 1,000 | 1,000 | 250 | 250 | 2,250 | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 진안고원 힐링 투어 프로그램 개발 | 국비 | 0 | 410 | | | | 110 | | 300 | | |
| | 도비 | 460 | 230 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 190 | |
| | 군비 | 640 | 360 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 40 | 160 | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 유휴 관광자원 활성화로 쉬어가는 공간 조성 | 국비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 도비 | 1,739 | 835 | 257 | 257 | 538 | 346 | 304 | 232 | 640 | |
| | 군비 | 143 | 143 | 143 | 143 | | | | | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 진안군 관광종합개발계획 수립 | 국비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 도비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 군비 | 165 | 165 | 165 | 165 | | | | | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

□ 천혜의 자연과 비경을 담은 드라이브 코스 활성화

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|--|--------|--|---------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2021 | 상반기 | · 용담호변 포토존 조성 실시설계용역 추진 | 20 | · 용담호변 포토존 조성 실시설계용역 착수 · 용담호변 포토존 조성 실시설계용역 완료 | 20 |
| | 하반기 | · 용담호변 포토존 조성(1개소) 완료 · 11개 읍면 차박하기 좋은 곳 수요 조사 및 발굴 | 50 | · 차박하기 좋은 곳 발굴 · 용담호변 포토존 조성 착공 | 40 |

□ 주요 경관자원을 활용한 힐링 체험벨트 구축

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|--|--------|---|---------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2020 | 하반기 | · 용담호변 관광자원화사업 사업계획 수립 · 운일암반일암 관광자원화 사업계획 수립 | 5 | · 용담호변 관광자원화사업 사업계획 수립 · 운일암반일암 관광자원화 사업계획 수립 | 5 |
| 2021 | 상반기 | · 용담호변 관광자원화사업 실시설계 용역 추진 · 운일암반일암 관광자원화(1차분) 실시설계용역 착수 · 연도별 마이산일원 개발사업 실시설계용역 추진 | 20 | · 용담호변 관광자원화사업 실시설계 용역 착수 · 운일암반일암 관광자원화 사업 실시설계 용역 착수 · 용담호변 관광자원화사업 실시설계 용역 완료 | 20 |
| | 하반기 | · 용담호변 관광자원화사업 완료 · 운일암반일암 관광자원화사업(1차분) 착공 · 연도별 마이산일원 개발사업 완료 | 40 | · 용담호변 관광자원화사업 행정절차 이행 · 운일암반일암 관광자원화 사업 실시설계 용역 완료 · 용담호변 관광자원화사업 완료 · 운일암반일암 관광자원화사업(1차분) 착공 | 40 |

□ 진안고원 힐링 투어 프로그램 개발

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|---|--------|---|---------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2020 | 하반기 | · 진안·무주 국가지질공원 탐사프로그램 공모 선정 | 5 | · 진안·무주 국가지질공원 탐사프로그램 공모 선정 | 5 |
| 2021 | 상반기 | · 마이산 관광 홍보마케팅 추진 · 진안·무주 국가지질공원 탐사프로그램 기본계획 수립 착수 | 20 | · 마이산 관광 홍보마케팅 추진(3건) · 진안·무주 국가지질공원 탐사프로그램 기본계획 수립용역 착수 · 문체부 계획공모형 지역관광개발 공모 사업 선정 * 마이 힐링 진안, 케렌시아 프로젝트(138억원) | 20 |
| | 하반기 | · 마이산 관광 홍보마케팅 추진 · 진안·무주 국가지질공원 탐사프로그램 기본계획 수립 및 기반사업 실시설계 완료 | 40 | · 진안 홍보 마케팅 추진(6건) - 지하철 광고 3건, 언론사 홈페이지 배너 광고 3건 · 진안·무주 국가지질공원 탐사프로그램 기본계획 수립용역 추진 · 진안 홍보 마케팅 추진(10건) · 진안·무주 국가지질공원 탐사프로그램 기본계획 수립용역 추진 | 35 |

☐ **유희 관광자원 활성화로 쉬어가는 공간 조성**

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|--|-----------|--|------------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2020 | 하반기 | · 그라스정원 조성사업 실시설계용역 완료 | 5 | · 그라스정원 조성사업 실시설계용역 완료 | 5 |
| 2021 | 상반기 | · 마이 그린테라피 조성사업(2차분) 실시설계 완료 · 마이산 북부 관광안내체계 구축 추진계획 수립 · 그라스정원 조성사업 착공 및 완료 | 20 | · 마이 그린테라피 조성사업(2차분) 실시설계 완료 및 사업 착공 · 마이산 북부 관광안내체계 구축 추진 계획 수립 · 마이 그린테라피 조성사업(2차분) 완료 · 마이산 북부 관광안내체계 구축 착공 · 그라스정원 조성사업 완료 | 20 |
| | 하반기 | · 마이 그린테라피 조성사업(2차분) 완료 · 마이산 북부 관광안내체계 구축 (1차분) 완료 | 40 | · 마이산 북부 관광안내체계 구축 추진 · 마이산 북부 관광안내체계 구축 추진 | 35 |

☐ **진안군 관광종합개발계획 수립**

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|--|-----------|--|------------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2020 | 하반기 | · 진안군 관광종합개발계획 수립용역 착수 · 주민 의견청취 및 관광분야 전문가 자문 추진 | 20 | · 진안군 관광종합개발계획 수립용역 착수 · 진안군 관광종합개발계획 관련 주민 인터뷰 추진 | 20 |
| 2021 | 상반기 | · 진안군 관광종합개발계획 수립용역 추진 | 50 | · 진안군 관광종합개발계획 수립용역 추진 | 50 |
| | 하반기 | · 진안군 관광종합개발계획 수립용역 완료 | 100 | · 진안군 관광종합개발계획 수립용역 중간보고회 개최 · 진안군 관광종합개발계획 수립용역 최종보고회 개최 · 진안군 관광종합개발계획 수립용역 완료 | 100 |

5 | 향후 추진계획

☐ **천혜의 자연과 비경을 담은 드라이브 코스 활성화**

- 용담호 포토존 조성 1개소 완료 : '22. 03.

☐ **주요 경관자원을 활용한 힐링 체험벨트 구축**

- 운일암반일암 관광자원화사업(1차분) 완료 : '22. 11.

☐ **진안고원 힐링 투어 프로그램 개발**

- 진안·무주 국가지질공원 탐사 프로젝트 기본계획 수립 : '22. 02.
- 진안·무주 국가지질공원 탐사 프로젝트 사업 추진 : '22. 03. ~

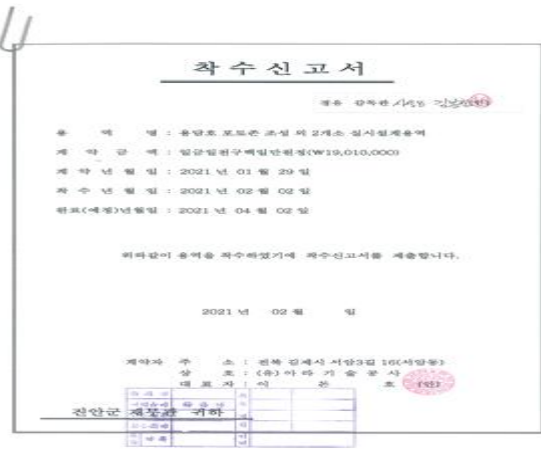


□ **유희 관광자원 활성화로 쉬어가는 공간 조성**

- 마이산북부 관광안내체계 구축(1차분) 완료 : '22. 03.
- 마이산북부 관광안내체계 구축(2차분) 추진 : '22. 04. ~
- 마이 그린테라피 조성사업(3차분) 추진 : '22. 03. ~

□ **진안군 관광종합개발계획 수립**


- 관광종합개발계획 활용한 체계적 관광개발 추진 : '22. 01. ~

6 **관련사진**

| 용담호 포토존 조성 실시설계용역 착수 | 용담호변 포토존 조성 착공 |
|---|---|
|  |  |
| 용담호변 관광자원화사업 실시설계용역 착수 | |
|  | |

- 14 -

운일암반일암 관광자원화사업(1차분) 착공

공작권 계약 : 

착 공 계

| | | | |
|---------------|----------------|----------------------------------|--|
| 공 사 명 | 운일암반일암 관광자원화사업 | | |
| 계 약 금 액 | 1차분 | 일금일십오억삼천칠십만원사천원정(W1,530,114,000) | |
| | 잔액분 | 일금이십삼억사천오백칠십만원정(W2,345,708,000) | |
| 계 약 년 월 일 | 2021년 11월 11일 | | |
| 착 공 년 월 일 | 2021년 11월 16일 | | |
| 준 공 예 정 년 월 일 | 1차분 | 2022년 05월 14일 | |
| | 잔액분 | 2022년 11월 10일 | |

상기와 같이 착공하였기에 착공계를 제출합니다.

2021년 11월 16일

고 장 관 고 장 관 동 리 로 26 2 통
관 리 관 동 리 관 리
대 표 이 사 김 동


진 안 군 재 무 관 귀 하

마이산 관광 홍보 실적

| | |
|------|--------------|
| 문서번호 | 관광과 - 2324 |
| 보존기간 | 년 |
| 보급일자 | 2021. 2. 29. |
| 공제처 | 부 |

| | | | | | |
|-----|----------|------|------|-----|----|
| 담당자 | 마이산 관리팀장 | 관광과장 | 한진원정 | 부순수 | 순수 |
| 승인 | 정익진 | 전진 | 유병진 | | |
| 협조 | | | | | |

진안군 마이산도립공원 홍보

 진 안 군
진안고원 (관 광 과)
JINAN GOWON

진안군 마이산도립공원 홍보

진안군의 대표관광인 마이산도립공원 대중적 홍보와 소통을 위해 국가 관광거점도시 전주(전주한옥마을) 및 전라북도를 찾는 전국 관광객들을 대상으로 널리 홍보하고자 함

□ 개 요

- 광고전명 : 진안군 대표관광 마이산도립공원 홍보
- 광고기간 : 2021. 3월 ~ 2021. 7월(연제)
- 광고매체 : 전주한옥마을(미디어전북)
- 간행부수 : 본간(매거진) 월평균 8천부, 별책(리플렛) 월평균 1만6천부
- 대중교통시설, 숙박시설 등 다중이용시설 배부
- 소요예산 : 10,000만원
- 예산과목 : 제작한 공헌환경 조성, 공헌관리, 도립공원관리, 알뜰한알미, 사무관리비

□ 홍보계획

- 3월호 : 본간(매거진), 별간(스트리트스토리)
- 마이산 전면광고, 8면 중 광고
- 4월호 : 본간(매거진), 별간(스트리트스토리)
- 전면광고, 스토리형 홍보 등 진안군 관광 볼 관련 내용
- 5월호 : 본간(매거진), 별간(스트리트스토리)
- 전면광고, 스토리형 홍보 등 진안군 관광 볼 관련 내용
- 6월호 : 본간(매거진), 별간(스트리트스토리)
- 전면광고, 스토리형 홍보 등 진안군 관광 볼 관련 내용
- 7월호 : 본간(매거진), 별간(스트리트스토리)
- 전면광고, 스토리형 홍보 등 진안군 관광 볼 관련 내용

□ 광고 의뢰 및 지급

- 의 의 : 한국인문진흥재단 의뢰
- 근거 : 정부광고 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 제5조
- 지 급 : 매월 청구에 의한 월별 지급

마이산 관광 홍보 실적



마이산 관광 홍보 실적

사람과 자연이 함께하는 힐링공간

진안 마이산

수신 내부결재 (결속)

제목 진안고원 대표 관광명소 마이산 홍보 광고의뢰


경부광고 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 제5조에 의거 진안고원의 대표 관광 명소인 마이산 홍보를 위해 아래와 같이 광고 의뢰하고자 합니다.

1. 광고건명 : 진안고원 대표 관광명소 마이산 홍보
2. 광고일시 : 2021. 3. 9. ~ 4. 8.(1개월)
3. 광고매체 : 한국전통문화재단
4. 소요예산 : 금1,100,000원(금일백십만원)
5. 광고형태 : 배너광고
6. 예산과목 : 광고료, 광고기반확충및관리, 관광안내도홍보, 관광홍보, 일간운영비, 사무관리비





붙임 1. 경부광고요청서 1부
2. 광고(안) 1부. 끝

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|--------|-----|--------------|-----|------------------------|
| 주최자 | 진안고원 | 담당부서/직급 | 관광과/과장 | 연락처 | 063-430-4727 | 이메일 | jinan@www.jinang.co.kr |
| 발주자 | 한국전통문화재단 | 담당부서/직급 | 관광과/과장 | 연락처 | 063-430-4727 | 이메일 | jinan@www.jinang.co.kr |
| 시행 | 경부광고-0206 | 담당부서/직급 | 관광과/과장 | 연락처 | 063-430-4727 | 이메일 | jinan@www.jinang.co.kr |

주 55406 진안고원 대표 관광명소 마이산 홍보 1부
전화번호 063-430-4727 팩스번호 063-430-4727 / jinankorea@nate.com / 063-430-4727
개인정보 보호법 제35조 제2항에 따라 고지합니다.



마이산 관광 홍보 실적

| | |
|---|---|
| <div data-bbox="209 293 743 360">  <div>진안군</div>  </div> <p>수신 내부결재 (결유)</p> <p>제목 진안군 관광 홍보 광고료 및 수수료 지급</p> <p>관광과-7514(2021.07.06.)호와 관련하여 진안군 관광 홍보 광고료 및 수수료를 다음과 같이 지급하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 광고건명 : 진안군 관광 홍보 2. 지 급 액 : 금1,100,000원(금일백십만원) 3. 지 급 처 : 한국언론진흥재단(주) 4. 광고기간 : 2021. 7. 19. ~ 8. 18. 5. 지급방법 : 계좌이체 6. 예산과목 : 관광과 관광발전과홍보팀내 관광온라인홍보, 관광홍보, 일간신문광고, 사주전보(비) <p>붙임 청구서 등 1부, 끝.</p> <div data-bbox="209 846 743 987"> <p>주무관 김소영 진안군청 기획과 2021. 8. 11. 관광과장 김병준</p> <p>참조처</p> <p>이메일 관광과-4967@jinan.go.kr</p> <p>주 소 사 1 진안군청 기획과 100 진안읍북로27-2호 > TEL 056-330-2200</p> <p>전화번호 056-330-2200 팩스번호 056-330-2207 > FAX 056-330-2207 > E-MAIL 4967@jinan.go.kr > 홈페이지</p> <p>가정통신망주소 금호화 한가도</p> </div> | <div data-bbox="850 293 1385 360">  <div>진안군</div>  </div> <p>수신 내부결재 (결유)</p> <p>제목 진안군 관광 홍보 광고료 및 수수료 지급</p> <p>관광과-800K(2021.7.16.)호와 관련하여 진안군 관광 홍보 광고료 및 수수료를 다음과 같이 지급하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 광고건명 : 진안군 관광 홍보 광고 2. 지 급 액 : 금1,100,000원(금일백십만원) 3. 지 급 처 : 한국언론진흥재단(주) 4. 광고기간 : 2021. 7. 19. ~ 8. 18. 5. 지급방법 : 계좌이체 6. 예산과목 : 관광과 관광발전과홍보팀내 관광온라인홍보, 관광홍보, 일간신문광고, 사주전보(비) <p>붙임 청구서 등 1부, 끝.</p> <div data-bbox="850 846 1385 987"> <p>주무관 김소영 진안군청 기획과 2021. 8. 11. 관광과장 김병준</p> <p>참조처</p> <p>이메일 관광과-4967@jinan.go.kr</p> <p>주 소 사 1 진안군청 기획과 100 진안읍북로27-2호 > TEL 056-330-2200</p> <p>전화번호 056-330-2200 팩스번호 056-330-2207 > FAX 056-330-2207 > E-MAIL 4967@jinan.go.kr > 홈페이지</p> <p>가정통신망주소 금호화 한가도</p> </div> |
|---|---|


마이산 관광 홍보 실적

| | |
|--|--|
| <div data-bbox="421 1077 533 1122">전북금영정보</div> <div data-bbox="248 1207 703 1816">  </div> | <div data-bbox="799 1066 1430 1816">  </div> |
|--|--|

마이산 관광 홍보 실적

| 마이산 관광 홍보 실적 | 마이산 관광 홍보 실적 |
|--|--|
| <p>수신 내부결재 (경유) 제목 전라북도 대표관광지 마이산도립공원 홍보 광고료 및 수수료 지급(5차)</p> <p>관광과-145X(2021.02.18.)호와 관련하여 전라북도 대표관광지 진안 마이산도립공원 홍보 광고료 및 수수료 5차분을 다음과 같이 지급하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 광고건명 : 전라북도 대표관광지 진안 마이산도립공원 홍보 광고 2. 지급액 : 금5,000,000원(금오백만원) 3. 지급처 : 한국연분전통재단(주) 4. 광고기간 : 2021. 7. 1. ~ 7. 31. 5. 지급방법 : 계좌이체 6. 예산과목 : 관광과, 관광 기반 확충 및 관리, 관광기반조성, 대표관광지 육성, 일반 운영비, 사무관리비 <p>붙임 청구서 등 1부, 끝.</p> | <p>수신 내부결재 (경유) 제목 전라북도 대표관광지 마이산도립공원 홍보 광고료 및 수수료 지급(6차)</p> <p>관광과-145X(2021.02.18.)호와 관련하여 전라북도 대표관광지 진안 마이산도립공원 홍보 광고료 및 수수료 6차분을 다음과 같이 지급하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 광고건명 : 전라북도 대표관광지 진안 마이산도립공원 홍보 광고 2. 지급액 : 금5,000,000원(금오백만원) 3. 지급처 : 한국연분전통재단(주) 4. 광고기간 : 2021. 8. 1. ~ 8. 31. 5. 지급방법 : 계좌이체 6. 예산과목 : 관광과, 관광 기반 확충 및 관리, 관광기반조성, 대표관광지 육성, 일반 운영비, 사무관리비 <p>붙임 청구서 등 1부, 끝.</p> |

마이산 관광 홍보 실적

| 마이산 관광 홍보 실적 | 마이산 관광 홍보 실적 |
|--|--|
| <p>수신 내부결재 (경유) 제목 전라북도 대표관광지 마이산도립공원 홍보 광고료 및 수수료 지급(7차)</p> <p>관광과-145X(2021.02.18.)호와 관련하여 전라북도 대표관광지 진안 마이산도립공원 홍보 광고료 및 수수료 7차분을 다음과 같이 지급하고자 합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 광고건명 : 전라북도 대표관광지 진안 마이산도립공원 홍보 광고 2. 지급액 : 금5,000,000원(금오백만원) 3. 지급처 : 한국연분전통재단(주) 4. 광고기간 : 2021. 9. 1. ~ 9. 30. 5. 지급방법 : 계좌이체 6. 예산과목 : 관광과, 관광 기반 확충 및 관리, 관광기반조성, 대표관광지 육성, 일반 운영비, 사무관리비 <p>붙임 청구서 등 1부, 끝.</p> |  <p>진안은 여행도 영화가 됩니다</p> <p>포토나인으로 지정파워 100%도 빈한 '합사'를 품은 마이산에서 치유하세요.</p> <p>마이산·진안·진안도립공원·진안군·진안읍·마이산</p> |

마이산 관광 홍보 실적



마이산 관광 홍보 실적



마이산 관광 홍보 실적

| | | |
|---|---|---|
|  서울특별시 | 서울시는 자리가 넓어 어떤 모습일지 진 안 권 서울도시개발공사 |  한국개발은행 한민통신평신금융 |
| 수선 내부공간 (경유) | | |
| 제책 잔안론 관공물보 의회 | | |
| 장부랑고 및 공공법인 물의 광고시행에 관한 법을 제5조에 의거 잔안론 관공물보 광고를 위하여 아래와 같이 광고 의뢰하고자 합니다. | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 광고건명 : 잔안론 관공물보 광고 2. 광고일자 : 2021. 12. 6. ~ 12. 12.(기간 총 3건) 3. 광고매체 : 한국언론진흥재단(3건) 4. 소요예산 : 금3,300,000원(금삼백삼십만원) 5. 광고형태 : 홈페이지 배너광고 및 자판광고 6. 예산과목 : 전광파 관공(전광파관공) 관공(대형관공물보, 관공물보, 일반관공물보, 사후관리비) | | |
| 붙임 1. 장부랑고요청서 3부, 2. 광고(안) 1부, 별. | | |



진 안 군



수상 내부결재
(결유)

제목 진안고청 대표 관공영소 미이산 홍보 광고의뢰

정부광고 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 제50조에 의거 진안고청의 대표 관공영소인 미이산 홍보를 위해 아래와 같이 광고 의뢰하고자 합니다.

1. 광고간행 : 진안고청 대표 관공영소 미이산 홍보
2. 광고일시 : 2021. 11. 10. ~ 12. 09.(1개월)
3. 광고매체 : 한국연변종합매체
4. 소요예산 : 금1,100,000원(금일백십만원)
5. 광고형태 : 홈페이지 배너광고
6. 예산과목 : 관공청 대표관공영소인 미이산 홍보

붙임 1. 정부광고요청서 1부.
2. 광고(안) 1부, 끝.

마이 그린테라피 조성사업 실시설계용역 완료

완 료 계

강동경주 녹지공공사업단

용역명 : 마이 그린테라피 경관조성사업(2차분) 기존 토 실시설계용역
 계약금액 : 일금일천팔백십만원정(W11,710,000)
 계약년월일 : 2021년 01월 14일
 착수년월일 : 2021년 01월 14일
 완료(예정)년월일 : 2021년 04월 13일
 실제완료년월일 : 2021년 4월 9일

위와같이 용역을 완료하였기에 완료계를 제출합니다.

2021년 4월 9일

계약자 주소 : 전북 김제시 서암3길 16(서암동)

상호 : (유)아라기술공사

대표자 : 서은미 (인)

전안군 재무관 귀하

| | |
|-------|----|
| 구분 | 비고 |
| 1.10비 | 확충 |
| 1.20비 | 확충 |
| 1.30비 | 확충 |
| 1.40비 | 확충 |
| 1.50비 | 확충 |

마이 그린테라피 조성사업 준공

준 공 계

강동경주 녹지공공사업단

공사명 : 마이 그린테라피 경관조성사업(2차분)
 계약금액 : 일금일천팔백십만원정(W10,172,000)
 계약년월일 : 2021년 03월 26일
 착공년월일 : 2021년 03월 29일
 준공예정일 : 2021년 05월 27일
 실제준공일 : 2021년 05월 27일

상기 공사를 준공하였기에 준공계를 제출합니다

2021년 05월 27일

전북 전안군 전안읍 전안로 94-2
 유한회사전안정
 대표이사 박진영 (인)

전안군 재무관 귀하

| | |
|-------|----|
| 구분 | 비고 |
| 1.10비 | 확충 |
| 1.20비 | 확충 |
| 1.30비 | 확충 |
| 1.40비 | 확충 |
| 1.50비 | 확충 |

인쇄 : 강동경주 / 공문과 (2021-05-28 11:29:21)

공문번호 : 강동경주-6458 / 공문일자 : 2021. 05. 10

(별지 제1호 서식)

준 공 (납품) 검 사 조 서

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|---------------------|--|--|--|
| 공사명 (계약명) | 마이 그린테라피 경관조성사업(2차분) | | | | | |
| 도급자 | (유)전안정 (대표자 박진영) | | | | | |
| 계약금액 | ₩90,172,000원 (일금일천팔십만원정) | | 공산(금액) 내역 | | | |
| | | | 견공보합표 ₩ 296,441원 | | | |
| | | | 연공보합표 ₩ 388,917원 | | | |
| 최종(지급) 금액 | ₩70,070,530원 (일금칠천팔백십만원정) | | 기타 ₩ 1,416,112원 | | | |
| | | | 금액(합계) ₩ 2,101,470원 | | | |
| | | | | | | |
| 계약 | 2021년 3월 26일 | 준공(납품)기한 | 2021년 5월 27일 | | | |
| 착공 (착수) | 2021년 3월 29일 | 준공(납품)일 | 2021년 5월 27일 | | | |
| 준공(납품) 검사 | 2021년 6월 10일 | | | | | |
| 장 고 | 년 월 일 | | | | | |

별지 설계서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품)
 검사를 실시함

2021년 6월 10일

| | | | | | |
|-----|--------|------|----------------|--|--|
| 주무관 | 준공개발팀장 | 준공과장 | 강동 2021. 6. 10 | | |
| 준공팀 | 장세적 | 장병진 | | | |

검수자 : 관공과 직 : 서삼태급 성명 : 장서욱 (인)
 입회자 : 재무과 직 : 황용태급 성명 : 황순익 (인)

마이 그린테라피 조성사업-6458 / 1/1

그라스정원 조성사업 준공

작 공 계

| | |
|-----------|-------|
| 강북구보건소장직인 | |
| 소장 | 권영남 |
| 직무 | 보건소장 |
| 일련 | 제101호 |

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1. 공 사 명 | : 그라스정원 조성사업 |
| 2. 계 약 금 액 | : 금일여칠천오백만원정 (₩175,010,000원) |
| 3. 편 장 위 치 | : 전북·전남권 원안읍 단양리 카이산 관광단지 미로공원 일원 |
| 4. 공 사 수 량 | : 교육이식 8주와 |
| 5. 계 약 일 자 | : 2021. 02. 25. |
| 6. 착 공 일 자 | : 2021. 02. 26. |
| 7. 준 공 예 정 일 자 | : 2021. 04. 26. |

위와 같이 작동하였기 작동계를 제출합니다.

2021. 02. 26.

주 소 : 전안군 전안읍 전창로 22

성행 : 전한 문선왕 조합

프랑스 전

전안군수 귀하

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 원 | 매 | 차 | 구 |  |
| 내 | 화 | 보 | 중 | |
| 기 | | | 제 | |
| 리 | | | 회 | |
| 부 | | | 리 | |

준 공 계

| | |
|------------|-----|
| 감독관부원 결속확인 | |
| 소속 | 관동청 |
| 직무 | 복합팀 |
| 성명 | 전아람 |

1. 사 업 명 : 그리스정령 조성사업
2. 위 계 : 전라북도 진안군 마이산 관광단지 미로공원 일원
3. 공 사 주 상 : 교목이식8주 외
4. 당초계약금액 : 금175,010,000원(금일역실천오백일만원정)
5. 변경계약금액 : 금223,493,000원(금일역이천삼백사십구만원삼천원정)
6. 당초계약일자 : 2021년 02월 25일
7. 변경계약일자 : 2021년 04월 22일
8. 착 공 일 자 : 2021년 02월 26일
9. 완공 예정일 : 2021년 04월 26일

사업시행을 완료하였기 준공계를 제출합니다.

- 붙임 1. 사업완료결과신청서
2. 완료사진첩
3. 기타 계약서 발주자가 요구하는 사항 등

2021년 04월 26일

위 계량자

[illegible]

그라스정원 조성사업 준공

마이산 북부 관광안내체계 구축
추진계획 수립

인쇄 : 김봉철 / 관공과 (2021-09-18 11:29:26)

| | | | |
|------|--------|------|--------------|
| 등록번호 | 분류구-과목 | 출판일자 | 2021. 05. 02 |
|------|--------|------|--------------|

(별지 제1호 서식)

준공 (납품) 검사 조서

| | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 출 사 명 (계 약 명) | 그라스호텔 조성사업 | | | | |
| 도 급 자 | 전라남도청도청 대표 전 해 석 | | | | |
| 계 약금액 | ₩223,433,000원 (일곱억이천삼백사십구만삼천원) | 총 산(금 액) 내 역 | | | |
| | | 건립보장료 | ₩ | | |
| | | 연금보장료 | ₩ | 716,296원 | |
| | | 기 타 | ₩ | 718,704원 | |
| 최종(지급) 금 액 | ₩222,050,000원 (일곱억이천이백오만천원) | 광역(합계) | | | ₩ 1,435,000원 |
| 계 약 | 2021년 2월 9일 | 문공(남물)기한 | 2021년 4월 15일 | | |
| 확 공 (착 수) | 2021년 2월 15일 | 문 공(남물) 일 | 2021년 4월 15일 | | |
| 문공(남물) 일 사 | 2021년 4월 27일 | | | | |
| 결 고 | 년 월 일 | | | | |

별지 설계서 및 도면(과업지시서)에 의하여 위와 같이 문공(남물)
 공사를 할하였음.

| | | | | |
|--------------|--------|----------------------|--|--|
| 2021년 4월 29일 | | | | |
| 주무관 | 문공계통담당 | 관료담당 전공 201. 5. 1 | | |
| 공해장 | 장서국 | 문물전 | | |

접수자 관공과 직 사금회금 성명 장서국 (인)
 입회자 재무과 직 행정회금 성명 문공국 (인)

惠州海边的五缘建设-2019-1/1

마이산 대표관광지 관광 안내체계 개선사업 추진계획

④ 용역개요

- 용역 명: 마이산 책무 관공 안내체계 개선 디자인 및 제작, 설치 용역
- 범 위: 마이산 책무 관공단지
- 사 업 비: 232백만원(도비)
- 용역기간: 계약일로부터 7개월
- 사업내용
 - 조사 및 분석
 - 관공 안내체계 수립
 - 시현물 계획 및 디자인
 - 제작 및 설치

[2] 계약방법 비교분석

- 추진방안
- 제1안 : 일반 경쟁 입찰 방법 - 최저가격 낙찰방법
 - 입찰 정보를 공고하여 참가 자격을 갖춘 물품상 다수의 입찰자 입찰에 참가할 수 있도록 하고 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자의 순으로 계약이행능력 등을 심사하여 낙찰자 결정
 - 제2안 : 협상에 의한 계약 방법 - 기술제안서 평가방법
 - 용역의 전문성·기술성·장의성이 필요하거나 정보과학기술 등 입찰도가 높은 직역을 활용하여 고부가가치를 창출하는 사업에 대하여 입찰로부터 기술제안서를 받아 평가하여 입찰가격을 부여하는 제도
 - 기술평가와 가격평가점수를 합산 후 최저득점자를 우선협상대상자로 선정하여 가격 협상

마이산 북부 관광안내체계 구축 추진계획 수립

- 일반경영입찰 방법과 협상에 의한 계약 방법 장·단점 비교
- 추진절차 비교

| 구 분 | 일반경영입찰 | 협상에 의한 계약 |
|-------|---------------------|--------------------|
| 추진절차 | 입찰공고 : 소포기(24일) | 발주처로 입찰 : 소포기(24일) |
| | 개찰 : 소포기(1일) | 제안서제출 : 소포기(24일) |
| | 최저입찰자 선정 : 소포기(1일) | 입찰공고 : 소포기(24일) |
| | 협상실사서류제출 : 소포기(27일) | 입찰제 결정 : 소포기(24일) |
| | 계약일배 : 소포기(29일) | 발가계약 : 소포기(24일) |
| | 낙찰자 결정 : 소포기(24일) | 제안서 : 소포기(24일) |
| | 계약체결 : 소포기(1일) | 추진절차담당자 : 소포기(24일) |
| | | 협상 : 소포기(24일) |
| 소요예산일 | 약 25일 | 약 36일 |

- 장·단점

| 구 분 | 일반경영입찰 | 협상에 의한 계약 |
|-----|---|--|
| 장 점 | <ul style="list-style-type: none"> 다수의 희망자에게 참여 기회 부여 가격 경쟁에 따른 예산절감 계약일자 조속한 적용 | <ul style="list-style-type: none"> 재안명가를 통해 일정 수준 이상 입찰 경쟁 가능 기술평가 시 외부평가위원을 활용하여 평가를 실시함으로써 객관성 다소 확보 협상을 통한 추진방향 보완 및 책정 금액 계약 가능 |
| 단 점 | <ul style="list-style-type: none"> 부적합업체의 참가로 과도한 경쟁 초래 계약이행의 부실 우려 | <ul style="list-style-type: none"> 발주처에서 계약까지 수행절차가 복잡하고 시간이 상대적으로 많이 소요됨 기술력평가에서 1순위인 업체가 가격 평가 합산결과 후순위로 밀리는 경우 발생함 |

[3] 부서 의견

- 일반경영입찰 방법은 **부적합업체 낙찰 가능성 및 계약이행의 부실 우려**가 있고, **기분제책 수립, 실사현제, 계약 및 설치 단계별 행정절차 이행** 요구되며, **각 단계별 사업수행자 상이로 사업 추진 난이도 상승**
- 협상에 의한 계약 방법은 **사전에 기술제안서에 대하여 전문가들로부터 평가를 받고, 사업의 계획부터 완료까지 기술력을 갖춘 업체가 일체 수행함에 따라 행정절차 간소화 및 업체 장의실 보충, 공정관리 등의 용이함** 등 일반경영입찰 방법보다 **사업의 완성도가 높은 것으로 판단됨**
- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 (협상에 의한 계약제안)에 따라 협상에 의한 계약으로 제안서 평가 등을 통해 일정 수준 이상의 업체를 선정하여 용역 추진함이 타당함 것으로 사료함

[4] 용역 수행기관 선정기준

○ 선정절차



- 제안서 평가방법 : 별도 세부 평가계획 수립 시행
- 평가방법 : 제안서 평가위원회 구성 및 실시
- 제안서 평가위원회 구성 : 위원장 포함 7인 이상 10인 이내 구성
- 평가항목(안) : 정량적 평가(20%), 정성적 평가(60%), 가격 평가(20%)

○ 참가자격

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 입찰참가자격을 갖추고, 같은 법 시행령 제92조 (부정당업자 및 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않는 업체로서 다음의 자격을 모두 갖춘 업체이거나 자격보완을 위해 업체 간 공동수급으로 참여한 업체

마이산 북부 관광안내체계 구축 추진계획 수립

가) 공고일 현재 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중·소기업 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제3조에 따른 소상공인으로서 「중·소기업·소상공인 및 장애인기업 확인요령」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인 확인서를 보유하고 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 제10조에 따른 직접생산 확인증서(안내부 [5512171801]과 조형물 [6012100201]를 모두 소지한 업체

※ 직접생산증명서 및 중·소기업·소상공인확인서는 제안서 제출하달일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함

나) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조에 따라 부정당업자로 입찰참가자격 제한 중에 있지 아니한 자

다) 필수 마감일 기준으로 등록 취소, 휴업, 폐업, 업무정지 및 자격정지 등에 있는 업체는 본 제안 공고에 참여할 수 없음

라) 아래 ① ~ ③ 항목의 자격을 모두 갖춘 업체(공동수급제 포함)

① 「산업디자인진흥법」 제2조 및 같은 법 시행규칙 제9조에 따라 산업디자인진흥회사(서각디자인분야 [4440], 환경디자인분야 [4442] 또는 산업디자인진흥회사(종합디자인분야 [4444])로 신고를 받은 업체

② 「산업디자인기본법」 제8조 및 제9조에 따라 전문공사를 시공하는 업종 중 조경시설을 설치공사업 등록을 필한 업체

③ 「옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 육성에 관한 법률」 제11조 규정에 따라 옥외광고업의 등록을 필한 업체

[5] 추진계획

- 협상에 의한 계약 타당성 검토 : 2021. 3.
- 용역 입찰공고 의뢰 : 2021. 3.
- 제안서 평가 및 계약체결 : 2021. 4.
- 용역착수 및 완료 : 2021. 4. ~ 10.

마이산 북부 안내체계구축 착수

착 수 계

※ 공 시 명 : 마이산 북부 관광 안내체계 개선 디자인 및 제작실시

※ 제 약 금 액 : - 금이역일 원호백칠십육만 원정 (W215,760,000)

※ 도 급 자 : ㈜뉴루프콘크리트

○ 제 약 일 자 : 2021년 6월 7일

○ 착 수 일 자 : 2021년 6월 8일

○ 본표(예정)일자 : 2022년 1월 3일

상기과 같이 착수하였기에 착수계를 제출 합니다.

2021년 06월 08일

업체명 : 주식회사 뉴루프콘크리트

주소 : 인천광역시 계양구 대보로 102

대표자 : 이장복

인재명 : 예브야드조경사

주소 : 서울특별시 용산구 서빙고로17, 업무동 1010호

대표자 : 정인영

| | |
|-------|-----|
| 발주기관장 | |
| 부서 | 시정과 |
| 직급 | 서장 |
| 성명 | 이성호 |

진안군 재무관 귀하

진안군 관광종합개발계획 수립용역 중간보고회 개최



수 신 : 정만군수

참 조 : 관변부세장

주 문 : “진안군 관광종합개발계획 수립용역”에 대한 착수금 지급을 구함.

1. 귀 회의 일차 방문을 기쁘합니다.
2. 귀 청고 2020년 11월 12일 제1회 회합한 “장안군 관광진흥개발계획 수립방안”에 대한 착수제를 청부와 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

* 附 录 : 我 国 的 工 业

물약수생태관광코스 1주

한글대리인계(파적증명서 포함) 1부

과업수행장애자(이력서 포함) 1부

보안각서 5부

산출내역서 1부

劉國永 鄧其鵬 周 華 編

재단법인 한국자치경제연구원이사장

| | | | |
|--|--------|--------|---------|
| 차장 김복근 | 형무 고현환 | 부장 박영희 | 대사장 김학호 |
| 발령일 2020-11-09 (2020.11.17.) | | | |
| 우(03139) 제주 자주시 교통번4길 89 (연동, 주흥빌딩 4층) / http://www.rge.or.kr | | | |
| 전화 (064) 742-0136 / 전수 (064) 742-0137 / E-mail : rjrgel@naver.com / 공보 | | | |

| | |
|------|--------------|
| 등록번호 | 관공과·1991 |
| 등록일자 | 2021. 08. 26 |
| 출제일자 | 2021. 08. 21 |
| 공개구분 | 비공개 |



| 주무관 | 팀장 | 관공리상 | 인원관리 주무관 | 부군수 | 군수 |
|-----|-----|------|-------------|-----|-----|
| 김영희 | 김영희 | 정창원 | 정창원 | 정창원 | 정창원 |
| 김영희 | | | | | |

= 진안군 관광종합개발계획 수립용역 =



진안군 관광종합개발계획 수립용역 중간보고회 개최

진안군 관광종합개발계획 수립요역
중간보고회 개최 계획

□ 개 요

- 일 시 : 2021. 09. 08. (수) 10:00 -
○ 장 소 : 전인공정 재난상황실 (경기도 안성시 안성읍 안성로 100)
○ 모 고 자 : 재단법인 한국지적정보연구원 오창원 책임연구원
○ 참 석 자 : 군수, 부군수, 국장, 실과소용면장 등

□ 보고일정(안)

| 시 간 | 구 분 | 비 고 |
|-------------|-------------------|-----------|
| 10:00~10:01 | (1') 개 회 | 관광개발담당 |
| 10:01~10:40 | (39') 용 역 중 간 보 고 | 오창현 책임연구원 |
| 10:40~10:59 | (19') 질 의 · 응 답 | 오창현 책임연구원 |
| 10:59~11:00 | (1') 폐 회 | 관광개발담당 |

용역 추진상황

- 민간단체 관광종합개발계획 수립을하여 특수보고 : 2020. 12.
- 관광자원 현지조사 및 구별 인터뷰 : 2020. 12. - 2021. 03.
- 읍·면 의견청취 : 2021. 04.
- 관광객 대상 설문조사 실시 : 2020. 05.
- 집안과 관광 비전 도출 및 개발·진흥계획 구성 : 2021. 09. 13 - 14.

□ 보고회 내용

- 진안군 관광현황 및 이진분석 결과
- SWOT분석을 통한 계획과제 도출 결과
- 진안군 관광비전 및 목표(안)
- 관광자원 개발 및 진흥계획 구상(안)

□ 추진계획



금후계획

- 장안군 관광자원개발 및 진흥계획 수립 : 2021. 10
- 최종보고회 및 용역 완료 : 2021. 11

진안군 관광종합개발계획 수립용역 중간보고회 개최



진안군 관광종합개발계획 수립용역 최종보고회 개최



진안군 관광종합개발계획 수립용역 완료

RG&E 새한 한국자치경제연구원
Research Institute for Regional Governance & Economy of Korea

수 신 : 진안군수

참 조 : 관련부서요

제 목 : "진안군 관광종합개발계획 수립용역"에 대한 완료제 제출

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 기관과 2020년 11월 17일 계약 체결한 "진안군 관광종합개발계획 수립용역"에 대한 완료제를 첨부와 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 첨부 : 완료제 일화서류 1부, 공.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 일 | 일 | 일 | 일 |
| 일 | 일 | 일 | 일 |
| 일 | 일 | 일 | 일 |
| 일 | 일 | 일 | 일 |
| 일 | 일 | 일 | 일 |

재단법인 한국자치경제연구원이사장

차장 권위자, 팀장 김태원, 실장 권연희, 이사장 김학오
한글년 2021-12-04 (2021. 12. 10.)
우(63139) 제주 제주시 과학북4길 89 (만동, 주흥빌딩 4층) / <http://www.rge.or.kr>
전화 (064) 742-0135 / 전속 (064) 742-0137 / E-mail : rige@naver.com / 공개

(별지 첨부호 서식)

준 공 (납품) 검 사 조 서

| | | | | |
|------------------|-------------------------------|------------|---------------|---|
| 공 사 명 (계 약 명) | 진안군 관광종합개발계획 수립용역 | | | |
| 도 급 자 | 재단법인 한국자치경제연구원 대표 김학오 | | | |
| 계약금액 | 금 165,000,000원 (금일역백천오백만원) | 정 산 내 역 | | |
| | | 관감보합료 : W | - | 원 |
| | | 연금보합료 : W | - | 원 |
| 지급금액 | 금 165,000,000원 (금일역백천오백만원) | 기 타 : W | - | 원 |
| | | 감역(합계) : W | - | 원 |
| 계 약 | 2020년 11월 12일 | 준공(납품)기한 | 2021년 12월 11일 | |
| 작 공 (착 수) | 2020년 11월 17일 | 준 공(납품)일 | 2021년 12월 10일 | |
| 준공(납품) 검 사 | 2021년 12월 21일 | | | |
| 결 고 | 년 월 일 | | | |

별지 설계서 및 도면(공업자시서)에 의하여 위와 같이 준공(납품) 검사를 완료하였음.

2021년 12월 21일

| | | | | | |
|-----|--------|------|--------|-----|-----|
| 주무관 | 관광개발팀장 | 관광과장 | 관광복지과장 | 부과수 | 문 수 |
| 김동현 | 김서록 | 김영 | 김영 | | |

검사자 : 관광과, 작 : 지방사무주사, 성명 : 장 서 역
입회자 : 재무과, 작 : 지방행정주사, 성명 : 김 순 역

우화산 생활체육공원 조성

| 주관부서 (담당자, 전화) | 문화체육과 (이화정, 430-2376) | 사업구분 | 임기 후 | 유 형 | 신규 |
|-------------------|--------------------------|-------|----------|-----|----|
| 사업기간 | 2020. ~ 2022. | 소요예산 | 1,800백만원 | | |
| 이행현황 | 정상추진 | 이 행 률 | 30% | | |

1 공약 최종목표

- 도시숲을 연계한 체육생태공원 확충으로 군민의 건강증진과 만남의 장소 제공

2 사업개요

- 사업기간 : 2020. ~ 2022.
- 장 소 : 진안읍 군하리 64-1번지 우화산 일원
- 내 용 : 우화정 정비 1식, 체육광장 조성 1식, 산책로 조성 0.8km 등

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

| 세부사업 | 구분 | 계 | | '20 | | '21 | | '22.6. | | 임기후 | |
|---------------------|----|-------|-------|-----|----|-------|-------|--------|----|-----|----|
| | | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 |
| | 계 | 1,800 | 1,890 | 0 | 90 | 1,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 우화산 생활체육공원 조성 | 국비 | 540 | 540 | | | 540 | 540 | | | | |
| | 도비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 군비 | 1,260 | 1,350 | | 90 | 1,260 | 1,260 | | | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|--|--------|---|---------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2020 | 하반기 | · 체육진흥시설 지원사업(군특) 공모 선정 | 10 | · 체육진흥시설 지원사업(군특) 공모선정 · 군계획시설(월랑공원 : 체육공원) 조성계획 변경 및 실시설계 용역 발주 | 10 |
| 2021 | 상반기 | · 군계획시설(월랑공원 : 체육공원) 조성계획변경 및 실시설계 용역 동시추진 | 20 | · 군계획시설 조성계획변경 및 실시설계 용역 추진 · 지질조사 및 군관리계획(산책로 7개소 반다비체육센터예정부지) 반영 추진 | 20 |
| | 하반기 | · 군계획시설(월랑공원 : 체육공원) 조성계획변경 변경 완료 | 30 | · 진안군관리계획결정(변경)신청(' 21.8.17.) · 전라북도 원가심사 의뢰(' 21.9.27.) · 진안군 일상감사 완료(' 21.10.5.) · 전라북도 원가심사 완료(' 21.10.20.) · 실시계획인가 관련부서 사전협의(' 21.11.17.~12.6) · 진안 군계획시설사업 실시계획인가 신청(' 21.12.9.) | 30 |

5

향후 추진계획

- 진안 군계획시설사업 실시계획인가 : 2021. 1.
- 공사 착공 및 완료 : 2022. 1. ~ 2022. 12.

6

관련사진



우화산 전경 : 진안읍 군하리 64-1번지 일원

진안고원 웰빙 산골음식 세계화 기반 구축

| 주관부서 (담당자, 전화) | 농촌지원과 (구한결, 430-8631) | 사업구분 | 임기 내 | 유 형 | 신규 |
|-------------------|--------------------------|-------|--------|-----|----|
| 사업기간 | 2020. 7. ~ 2022. 12. | 소요예산 | 105백만원 | | |
| 이행현황 | 정상추진 | 이 행 률 | 60% | | |

1 공약 최종목표

○ 진안고원 웰빙산골음식 조사(개발) 및 실용화를 통한 지역경제 활성화

2 사업개요

- 사업기간 : 2020. 7. ~ 2022. 6.
- 장 소 : 진안고원 일원
- 내 용
 - 진안고원 웰빙산골음식 추진 계획 수립 및 음식문화관광 자원화
 - 진안고원 산골음식문화 기초조사 학술연구
 - 산골(대표)음식 레시피 표준화를 통한 음식업소 적용
 - 진안고원 웰빙산골음식 학술대회 및 전시·품평회

3 연도별 투자계획 대비 집행(확보)액

(단위: 백만원)

| 세부사업 | 구분 | 계 | | '20 | | '21 | | '22.6. | | 임기후 | |
|----------------------------|----|-----|-------|-----|----|-----|------|--------|----|-----|----|
| | | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 | 계획 | 확보 |
| | 계 | 165 | 225 | 5 | 5 | 80 | 132 | 80 | 88 | 0 | |
| 진안고원 웰빙산골음식 세계화 기반구축 | 국비 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 도비 | 25 | 34.6 | | | 25 | 34.6 | | | | |
| | 군비 | 140 | 190.4 | 5 | 5 | 55 | 97.4 | 80 | 88 | | |
| | 기타 | 0 | 0 | | | | | | | | |

4

연도별 추진계획(목표) 대비 추진실적(달성률)

| 구 분 | | 추진계획 | | 추진실적 | |
|------|-----|---|--------|--|---------|
| | | 내 용 | 목표 (%) | 내 용 | 달성률 (%) |
| 2020 | 하반기 | <ul style="list-style-type: none"> · 진안고원 웰빙산골음식 추진 총괄 계획 수립 · 진안고원 웰빙산골음식 실용화 스터디 운영 | 20 | <ul style="list-style-type: none"> · 진안고원 개발음식 리뉴얼 스터디 운영 웰빙 산골(대표)음식 발굴 <ul style="list-style-type: none"> - 진안고원 개발음식 리뉴얼 스터디 : 2020. 7. ~ 12.(7회) - 대표음식 브랜드 ‘산골愛饌(애찬)’ 및 대표 음식 10종 개발 - ‘산골愛饌(애찬)’ 전시회 개최 : 2020. 12. 15. | 20 |
| 2021 | 상반기 | <ul style="list-style-type: none"> · 진안고원 산골음식문화 기초조사 · 산골(대표)음식 표준화 및 실용교육 (1차, 2차) | 40 | <ul style="list-style-type: none"> · 진안고원 산골음식문화 기초조사 착수 : 2021. 3. ~ 7. · 산골애찬 적용 음식점 실용교육 추진 : 2021. 2. 17. ~ 24.(2회) <ul style="list-style-type: none"> - 교육대상 : 8개소(산골애찬 개발메뉴 적용업소) · 산골愛饌(애찬)’ 브랜드 상표 출원 : 2021. 4. · 마을 특산자원 활용 산골애찬 실용교육 : 2021. 4. ~ 6.(18회) <ul style="list-style-type: none"> - 교육대상 : 6개소(농촌체험휴양마을) · 진안고원 식문화 기초조사 학술용역 중간 보고회 : 2021. 6. 14. | 40 |
| | 하반기 | <ul style="list-style-type: none"> · 산골(대표)음식 스토리텔링 발굴 및 실용교육(3차) | 60 | <ul style="list-style-type: none"> · 진안고원 식문화 기초조사 학술용역 최종 보고회 : 2021. 9. 1. · 산골애찬 적용 안전먹거리사업장 품질 향상 지원사업 완료 : 8개소 · 산골애찬 상표등록 완료(5개류) <ul style="list-style-type: none"> * 등록일 : 2021. 8. 24. · 인플루언서 활용 진안 관광자원 및 산골애찬 홍보 : 2회 · 체류형 음식관광상품 진안고원 스테이 여행플랫폼 등록(엔타비글로벌) · 산골애찬 실용교육(3기) : 2021. 10. 7. ~ 21.(5회) | 60 |

5

향후 추진계획

- 산골애찬 메뉴 적용 희망업주(4개소) 모집 및 컨설팅 : 2022. 3. ~ 12.
- 진안고원 산골음식 관련 학술대회(상반기) 및 전시회 : 2022. 5. ~ 10.



인플루언서 활용 투어 및 여행플랫폼 등록



산골애찬 실용교육(3기)



진안고원
JINAN GOWON

사람과 자연이 함께하는 희망 진안
www.jinan.go.kr
